

คู่มือการใช้งาน

สำหรับ ผู้ดูแลระบบย่อย (สหกรณ์จังหวัด)

โครงการระบบงานบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์



บริษัท บีซโพเทนเชียล จำกัด





สารบัญ

บทที่ 1 การเข้าสู่ระบบ (Log in).....	1
บทที่ 2 ระบบเครื่องมือกลาง	4
2.1 จัดการข้อมูลบุคลากร	4
2.1.1 การแก้ไขข้อมูลบุคลากร	4
บทที่ 3 งาน/โครงการ/กิจกรรม.....	6
3.1 จัดทำงาน/โครงการ/กิจกรรม.....	6
3.1.1 การเรียกดูรายละเอียดข้อมูลงาน/โครงการ.....	6
3.1.2 การบริหารสิทธิ์งาน/โครงการ.....	8
บทที่ 4 บริหารงานโครงการ	10
4.1 วางแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ	10
4.1.1 การวางแผนการดำเนินงานโครงการ.....	10
4.1.2 การเรียกดูข้อมูลของโครงการ.....	14
4.1.3 การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ	16
4.1.4 การเรียกดูข้อมูลของกิจกรรมย่อย.....	19
4.2 ตั้งค่าการแจ้งเตือน – กำหนดส่งรายงาน.....	21
บทที่ 5 รายงานความก้าวหน้า	23
5.1 รายงานผลงาน/โครงการ/กิจกรรม.....	23
5.1.1 การบริหารปัจจัยเสี่ยง งาน/ โครงการ/ กิจกรรม	23
5.1.2 กระดานข้อความ	26
5.1.3 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด.....	28
5.1.4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ.....	30
5.1.5 รายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการ	33
5.1.6 ประวัติการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัด.....	36
5.1.7 ประวัติการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ	37
5.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่คุณเกี่ยวข้อง.....	38








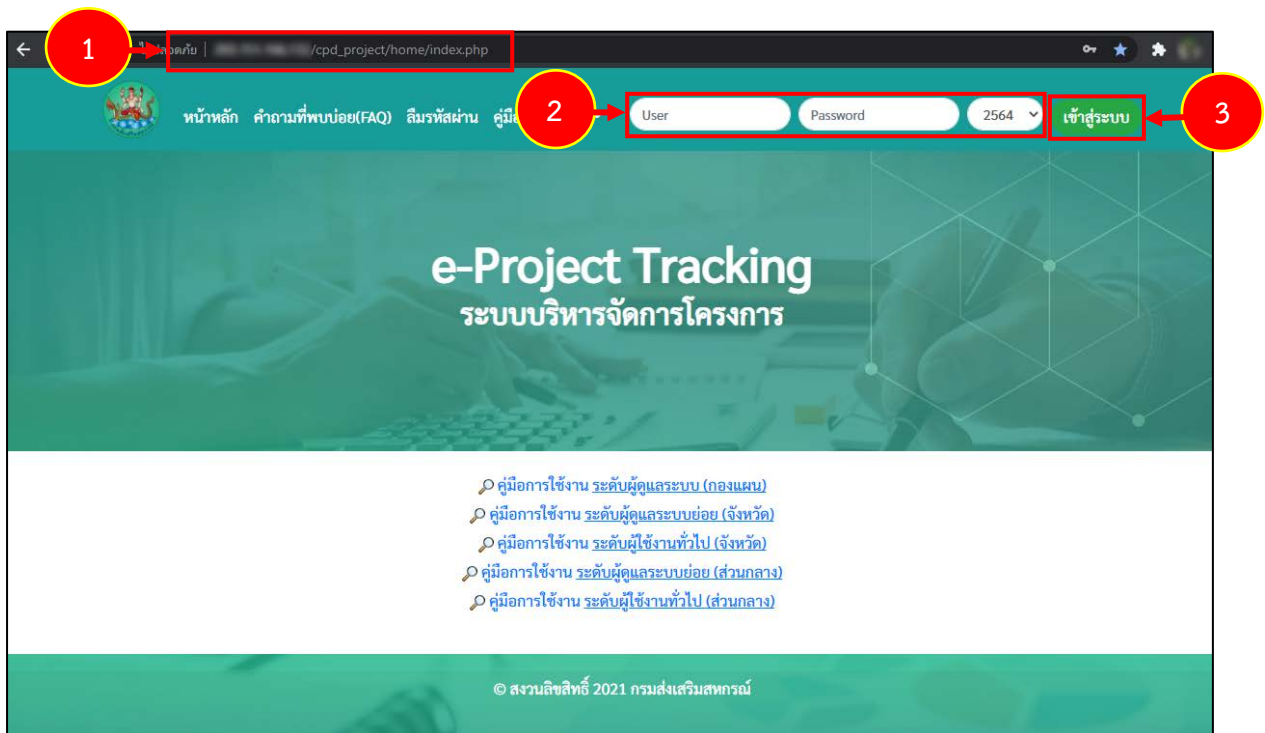
บทที่ 6 ระบบรายงาน.....	39
6.1 รายงานยุทธศาสตร์, แผนงานประจำปี.....	39
6.2 แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการ (Action Plan).....	40
6.3 แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ.....	41
6.4 แบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ โครงการ.....	42
6.5 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ สะสมทั้งปี.....	43
6.6 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง.....	44
6.7 รายงานสรุปการส่งรายงาน รายงานหน่วยงาน.....	45
6.8 สรุปการส่งรายงาน รายโครงการ.....	46
6.9 รายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายโครงการ.....	47
6.10 รายงานเบิกจ่ายต่องบประมาณเปรียบเทียบกับ % แผนการใช้จ่ายเงินต่อวงเงินงบประมาณ....	48
6.11 รายงานผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย).....	49
6.12 รายงานสรุป % ผลการเบิกจ่ายรายงานหน่วยงาน.....	50
6.13 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายรายงานหน่วยงาน.....	51
6.14 รายงานสถานะโครงการโดยรวม.....	52
6.15 รายงานการจัดการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง).....	53
6.16 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน.....	54
6.17 รายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือน.....	55
6.18 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS.....	56



บทที่ 1 การเข้าสู่ระบบ (Log in)

การเข้าใช้งานระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีขั้นตอนดังนี้


1. การใช้งานระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมส่งเสริมสหกรณ์ สามารถรองรับการเข้าใช้งานผ่าน Internet Browser ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน เช่น  Internet Explorer,  Google Chrome,  Mozilla Firefox,  Microsoft Edge หรือ  Safari จากนั้นกรอก URL ของระบบลงไปช่อง Address Bar แล้วคลิกปุ่ม Go หรือ Enter
2. ระบบจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login) ดังรูป ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และเลือกปีงบประมาณ
3. คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ



รูปที่ 1 แสดงหน้าจอ Login เข้าสู่ระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมส่งเสริมสหกรณ์



4. ระบบแสดงหน้าหลักระบบงานบริหารจัดการโครงการกรมส่งเสริมสหกรณ์ดังรูป
5. คลิกเมนู ระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ

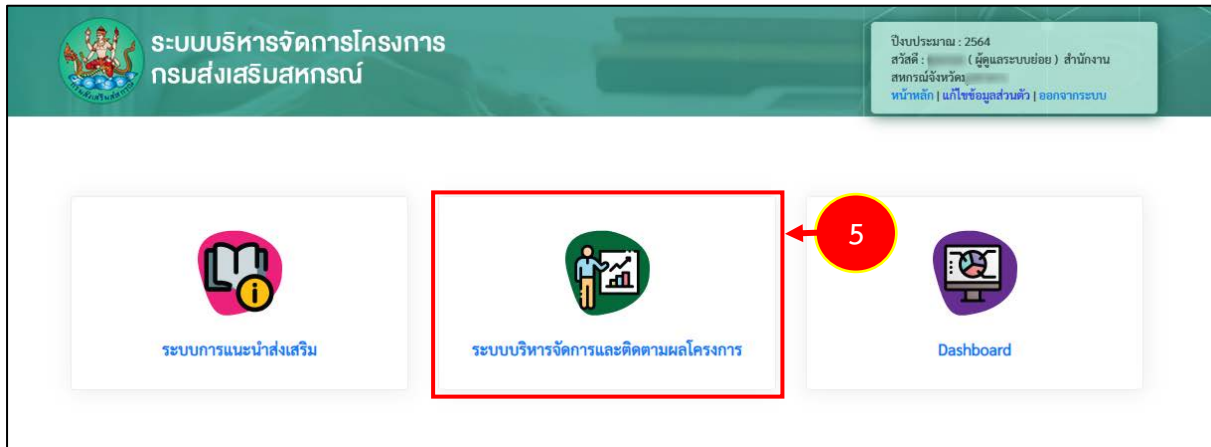

รูปที่ 2 แสดงหน้าหลักระบบงานบริหารจัดการโครงการกรมส่งเสริมสหกรณ์

6. แสดงหน้าจอระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการดังรูป ผู้ดูแลระบบสามารถคลิกแถบเมนูเพื่อใช้งานเมนูที่ต้องการ กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ให้คลิกที่ **แก้ไขข้อมูลส่วนตัว**

ลำดับที่	งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานของท่านที่ได้รับโอนแล้ว	การแจ้งเตือน	
1	ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินคสมสหกรณ์ (กำลังดำเนินการ)	01/10/2563 - 30/09/2564	4	1,110,600	106,922.50		
2	โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP (กำลังดำเนินการ)	01/10/2563 - 30/09/2564	3	13,195,900	4,800.00		
3	แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กำลังดำเนินการ)	01/10/2563 - 30/09/2564	10	246,466,800	3,300,700.00		
4	แบบ 2 ผลการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองระบบสหกรณ์ (กำลังดำเนินการ)	01/10/2563 - 30/09/2564	10	0	0.00		
5	โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน] (กำลังดำเนินการ)	01/10/2563 - 30/09/2564	7	3,715,700	4,200.00		
6	โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายนอกเหนือจากโครงการเสริมสร้าง] (กำลังดำเนินการ)	01/10/2563 - 30/09/2564	5	0	0.00		
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (กำลังดำเนินการ)	01/10/2563 - 30/09/2564	6	4,620,200	170,700.00		
8	โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กำลังดำเนินการ)	01/10/2563 - 30/09/2564	6	296,010,000	2,018,218.30		

หน้าที่ [1] แสดงทั้งหมด

รูปที่ 3 แสดงหน้าหลักระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ



7. ระบบแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลบุคลากรดังรูป ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ * นาย ผู้ดูแลจังหวัด

สกุล * วิทยากร

เพศ ชาย หญิง

หน่วยงาน * สำนักงานสทสรณจังหวัดจันทบุรี

ตำแหน่ง

ชื่อผู้ใช้ * admin_jan

รหัสผ่าน * (ใช้ภาษาอังกฤษ a-z, A-Z หรือตัวเลข 0-9 จำนวน 5-15 ตัวอักษร)

ยืนยันรหัสผ่าน * (ใช้ภาษาอังกฤษ a-z, A-Z หรือตัวเลข 0-9 จำนวน 5-15 ตัวอักษร)

ระดับผู้ใช้ * ผู้ดูแลระบบย่อย

เลขบัตรประชาชน

วุฒิการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์


มือถือ

E-mail

ที่อยู่ เลขที่ อาคาร หมู่ที่ ซอย ถนน

จังหวัด เขต/อำเภอ

แขวง/ตำบล รหัสไปรษณีย์

ใส่รูปภาพ: 

เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ ลบ

สถานภาพ * ยังทำงานอยู่

สถานะ(ให้ใช้งานระบบ) * ใช้งาน

Reset ค่าตั้งต้น Reset จำนวนครั้งที่ login Reset สิทธิทุกโครงการของคนนี้

รูปที่ 4 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลบุคลากร

8. กรณีต้องการออกจากระบบ (Log out) สามารถคลิกปิดหน้าจอระบบ หรือคลิกที่ ออกจากระบบ




ระบบบริหารจัดการโครงการ
กรบส่งเสริมสทสรณ

ปีงบประมาณ : 2564
สวัสดิ : (ผู้ดูแลระบบย่อย) สำนักงาน
สทสรณจังหวัด
หน้าหลัก | แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ระบบเครื่องมือกลาง งาน/โครงการ/กิจกรรม บริหารงานโครงการ รายงานความก้าวหน้า ระบบสืบค้นข้อมูล/ ระบบรายงาน

งาน/โครงการที่คุณเกี่ยวข้อง และผ่านการอนุมัติ

พบทั้งหมด 8 งาน/โครงการ

ลำดับที่	งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานของท่านได้รับโอนแล้ว	การแจ้งเตือน
1	ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินนิคมสทสรณ (กำลังดำเนินการ)	01/10/2563 - 30/09/2564	4	1,110,600	106,922.50	
2	โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสทสรณและกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP (กำลังดำเนินการ)	01/10/2563 - 30/09/2564	3	13,195,900	4,800.00	
3	แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสทสรณ/กลุ่มเกษตรกร (กำลังดำเนินการ)	01/10/2563 - 30/09/2564	10	246,466,800	3,300,700.00	

รูปที่ 5 แสดงหน้าหลักระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ



บทที่ 2 ระบบเครื่องมือกลาง

2.1 จัดการข้อมูลบุคลากร

ในส่วนนี้ผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลบุคลากรในจังหวัดได้

2.1.1 การแก้ไขข้อมูลบุคลากร

1. คลิกเมนู ระบบเครื่องมือกลาง >>> จัดการข้อมูลบุคลากร ดังรูป

ระบบบริหารจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ปีงบประมาณ : 2565
 สวัสดิ์ : คุณผู้ดูแลจังหวัด (ผู้ดูแลระบบย่อย)
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
 หน้าหลัก | แก้ไขข้อมูลส่วนตัว | ออกจากระบบ

ระบบเครื่องมือกลาง งาน/โครงการ/กิจกรรม บริหารงานโครงการ รายงานความก้าวหน้า รายงาน (1) รายงาน (2)

จัดการข้อมูลบุคลากร

พบทั้งหมด 1 งาน/โครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานของท่านได้รับโอนแล้ว	การแจ้งเตือน
1	แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทดสอบ (กำลังดำเนินการ)	01/10/2564 - 30/09/2565	1	500,000	2,000.00	

หน้าที่ [1] แสดงทั้งหมด

รูปที่ 6 แสดงหน้าหลักระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ

2. ระบบแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลบุคลากรดังรูป ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาข้อมูลบุคลากรโดยระบุเงื่อนไขที่ต้องการจากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
3. ระบบจะแสดงข้อมูลบุคลากรตามเงื่อนไขที่กำหนดดังรูป คลิกปุ่ม แก้ไข ตามที่ต้องการ

ระบบบริหารจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ปีงบประมาณ : 2565
 สวัสดิ์ : (ผู้ดูแลระบบย่อย) กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตร...
 หน้าหลัก | แก้ไขข้อมูลส่วนตัว | ออกจากระบบ

ระบบเครื่องมือกลาง งาน/โครงการ/กิจกรรม บริหารงานโครงการ รายงานความก้าวหน้า รายงาน (1) รายงาน (2)

จัดการข้อมูลบุคลากร

แสดงเฉพาะผู้ใช้ที่ สิทธิการใช้งาน ยังทำงานอยู่

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน่วยงาน	สิทธิการใช้งาน	สถานะ	
1	กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	ผู้ดูแลระบบย่อย	ยังทำงานอยู่	
2	กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	ผู้ใช้ทั่วไป	ยังทำงานอยู่	

หน้าที่ [1]

© สงวนลิขสิทธิ์ 2021 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รูปที่ 7 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลบุคลากร



4. ระบบแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลบุคลากรดังรูป เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม **บันทึก**

แก้ไขข้อมูลบุคลากร

ชื่อ *

สกุล *

เพศ ชาย หญิง

หน่วยงาน *

ตำแหน่ง

ชื่อผู้ใช้ *

รหัสผ่าน *
(ใช้ภาษาอังกฤษ a-z, A-Z หรือตัวเลข 0-9 จำนวน 5-15 ตัวอักษร)

ยืนยันรหัสผ่าน *
(ใช้ภาษาอังกฤษ a-z, A-Z หรือตัวเลข 0-9 จำนวน 5-15 ตัวอักษร)

ระดับผู้ใช้งาน *

เลขบัตรประชาชน


วุฒิการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์

มือถือ

E-mail

ที่อยู่ เลขที่ อาคาร หมู่ที่ ซอย ถนน
จังหวัด เขต/อำเภอ
แขวง/ตำบล รหัสไปรษณีย์

ใส่รูปภาพ: 

เลือกไฟล์ ลบ

สถานภาพ*

สถานะ(ให้ใช้งานระบบ)*

Reset ค่าตั้งต้น Reset จำนวนครั้งที่ login Reset สิทธิ์ทุกโครงการของคนนี้

รูปที่ 8 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลบุคลากร



บทที่ 3 งาน/โครงการ/กิจกรรม

3.1 จัดทำงาน/โครงการ/กิจกรรม

3.1.1 การเรียกรายละเอียดข้อมูลงาน/โครงการ

1. คลิกเมนู งาน/โครงการ/กิจกรรม >>> จัดทำงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังรูป

ระบบบริหารจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ปีงบประมาณ : 2565
 สวัสดิ์ : คุณผู้ดูแลจังหวัด (ผู้ดูแลระบบย่อย)
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
 หน้าหลัก | แก้ไขข้อมูลส่วนตัว | ออกจากระบบ

ระบบเครื่องมือกลาง **งาน/โครงการ/กิจกรรม** บริหารงานโครงการ รายงานความก้าวหน้า รายงาน (1) รายงาน (2)

งาน/โครงการ/กิจกรรม
 จัดทำงาน/โครงการ/กิจกรรม
 โครงการเหลือปี

พบทั้งหมด 1 งาน/โครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานของท่านได้รับโอนแล้ว	การแจ้งเตือน
1	แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทดสอบ (กำลังดำเนินการ)	01/10/2564 - 30/09/2565	1	500,000	2,000.00	

หน้าที่ [1] แสดงทั้งหมด

รูปที่ 9 แสดงหน้าหลักระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ

2. ระบบแสดงหน้าแรกงาน/โครงการดังรูป คลิกปุ่ม งาน/โครงการที่ต้องการ

หน้าแรกงาน/โครงการ/กิจกรรม

พบทั้งหมด 2 งาน/โครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ดำเนินงาน	ระหว่างวันที่	กำหนดตัวชีวิต	กำหนดกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	แผนงานที่
1	ทดสอบโครงการของ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ส่วนกลาง (กำลังดำเนินการ)	77 หน่วยงาน • กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ดูทั้งหมด	01/10/2564 - 30/09/2565	2	1	18,000,000	1
2	แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทดสอบ (กำลังดำเนินการ)	30 หน่วยงาน • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ดูทั้งหมด	01/10/2564 - 30/09/2565	8	1	500,000	1

รวมงบประมาณทุกงาน/โครงการ/กิจกรรมในหน้า 1 18,500,000 บาท

หน้าที่ [1] แสดงทั้งหมด

รูปที่ 10 แสดงหน้าหน้าแรกงาน/โครงการ




3. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลงาน/โครงการดังรูป ในส่วนนี้ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลทั่วไป, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, กำหนดค่าเป้าหมาย, การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน, อนุมัติโครงการ, สถานะการวางแผนงาน, ผลการดำเนินงาน, สถานะแผนเบิกจ่าย, ผลการเบิกจ่าย, สถานะเบิกจ่าย และปิดงาน/โครงการ โดยคลิกแท็บที่ต้อ

ข้อมูลทั่วไป	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน	จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน	อนุมัติโครงการ	สถานะการวางแผนงาน	ผลการดำเนินงาน	สถานะแผนเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ปิดงาน/โครงการ
รายละเอียดของงาน/โครงการ/กิจกรรม									
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม	งานแบบ 1 ผลเนบ่าส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทดสอบ								
วัตถุประสงค์									
สถานะการใช้งาน	กำลังดำเนินการ								
เจ้าของโครงการ:									
หมายเหตุ									
ระยะเวลา									
เริ่มต้น	01/10/2564								
สิ้นสุด	30/09/2565								
งาน งบประมาณ 2565									
งานนี้อยู่ภายใต้	แผนงาน: แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :								
เอกสารแนบ	<ul style="list-style-type: none"> png ทดสอบ1 png ทดสอบ2 								
	ชื่อตัวชี้วัด	ประเภทเป้าหมาย	เป้าหมาย	หน่วยนับ					
	สหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานมีความเข้มแข็งระดับ 1 และระดับ 2 รวมกันไม่น้อยกว่า	เชิงปริมาณ	90.00	ร้อยละ					
	กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานมีความเข้มแข็งระดับ 1 ไม่น้อยกว่า	เชิงปริมาณ	25.00	ร้อยละ					
	สหกรณ์ที่นำมาจัดมาตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า	เชิงปริมาณ	80.00	ร้อยละ					
	กลุ่มเกษตรกรที่นำมาจัดมาตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มเกษตรกร ไม่น้อยกว่า	เชิงคุณภาพ	81.00	ร้อยละ					
	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า เมื่อเทียบกับของปีที่ผ่านมา	เชิงปริมาณ	3.00	ร้อยละ					
	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน	เชิงปริมาณ	100.00	ร้อยละ					
	ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป เกิดกรณีการทุจริตในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	เชิงปริมาณ	0.00	แห่ง					
	ผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีกำไรประจำปี	เชิงปริมาณ	100.00	ร้อยละ					
ข้อมูลกิจกรรม ภายใต้งาน/โครงการ/กิจกรรม									
	ลำดับที่	กิจกรรม	ระหว่างวันที่	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ				
	1.	การปิดบัญชีของสหกรณ์ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีเดือน ก.ย. 64 - ส.ค. 65 [จัดทำงบการเงินเสร็จ และส่งหนังสือพร้อมเข้ารับการตรวจให้ผู้สอบบัญชีแล้ว]	01/10/2564 - 30/09/2565	6	100,000				
งบประมาณ									
	ประเภทงบ	งบประมาณ							
	งบบุคลากร	0.00 บาท							
	งบดำเนินงาน	500,000.00 บาท							
	งบลงทุน	0.00 บาท							
	งบเงินอุดหนุน	0.00 บาท							
	งบรายจ่ายอื่น	0.00 บาท							
	งบกลาง	0.00 บาท							
	งบประมาณทั้งหมด	500,000.00 บาท							
รูปแบบในการวางแผนใช้จ่าย : รายเดือน									

รูปที่ 11 แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลงาน/โครงการ





3.1.2 การบริหารสิทธิ์งาน/โครงการ

- ระบบแสดงหน้าแรงแรงงาน/โครงการดังรูป คลิกรูป  งาน/โครงการที่ต้องการ

หน้าแรงแรงงาน/โครงการ/กิจกรรม

พบทั้งหมด 2 งาน/โครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ดำเนินงาน	ระหว่างวันที่	กำหนดตัวชี้วัด	กำหนด กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	แผนงานที่	
1	ทดสอบโครงการของ กอง พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร ส่วนกลาง (กำลังดำเนินการ)	77 หน่วยงาน • กองพัฒนาสหกรณ์ ภาคการเกษตรและ กลุ่มเกษตรกร • สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดกระบี่ • สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี • สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ • สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดกำแพงเพชร ดูทั้งหมด	01/10/2564 - 30/09/2565	2	1	18,000,000	1	 รออนุมัติ
2	แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและ ผลการดำเนินงานของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทดสอบ (กำลังดำเนินการ)	30 หน่วยงาน • สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดกระบี่ • สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี • สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ • สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดกำแพงเพชร • สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น ดูทั้งหมด	01/10/2564 - 30/09/2565	8	1	500,000	1	 อนุมัติแล้ว วันที่อนุมัติ: 12/11/2564 09:16
รวมงบประมาณทุกงาน/โครงการ/กิจกรรมในหน้า 1						18,500,000	บาท	

หน้าที่ [1] แสดงทั้งหมด

รูปที่ 12 แสดงหน้าหน้าแรงแรงงาน/โครงการ



2. ระบบแสดงหน้าจอบริหารสิทธิ์ของผู้ดูแลตั้งรูป ให้คลิกที่รายชื่อจังหวัดที่ท่านดูแล

ระบบบริหารจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ปีงบประมาณ : 2565
สวัสดิ : คุณผู้ดูแลจังหวัด (ผู้ดูแลระบบย่อย)
สำนักงานสทสรณ์จังหวัดจันทบุรี
หน้าหลัก | แก้ไขข้อมูลส่วนตัว | ออกจากระบบ

ระบบเครื่องมือกลาง งาน/โครงการ/กิจกรรม บริหารงานโครงการ รายงานความก้าวหน้า รายงาน (1) รายงาน (2)

บริหารสิทธิ์ของผู้ดูแล > แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสทสรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทดสอบ

[กลับไป](#)

หน่วยงาน	จำนวนผู้ดูแล (คน)
กองคลัง	50
กองแผนงาน	57
สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกระบี่	47
สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกาญจนบุรี	45
สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์	50
สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกำแพงเพชร	47
สำนักงานสทสรณ์จังหวัดขอนแก่น	79
สำนักงานสทสรณ์จังหวัดจันทบุรี	52
สำนักงานสทสรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา	39
สำนักงานสทสรณ์จังหวัดชลบุรี	44
สำนักงานสทสรณ์จังหวัดชัยนาท	39

รูปที่ 13 แสดงหน้าจอบริหารสิทธิ์ของผู้ดูแล

3. ระบบแสดงหน้าจอบริหารสิทธิ์ตามงาน/โครงการที่เลือก ให้ทำเครื่องหมาย check box สิทธิ์ในการจัดการของแต่ละบุคคล จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก

บริหารสิทธิ์ของผู้ดูแล > งาน/โครงการ/กิจกรรมแบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสทสรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทดสอบ

หน่วยงานของผู้ดูแล : สำนักงานสทสรณ์จังหวัดจันทบุรี

ผู้รับผิดชอบ	ระดับผู้ใช้งาน	เจ้าของโครงการ	สิทธิ์ในการจัดการ															
			ดูงาน/โครงการ/กิจกรรมได้	เพิ่มกิจกรรมได้	แก้ไขงาน/โครงการ/กิจกรรมได้	จัดสรรงบประมาณ	โอนเงิน	ลงงาน/โครงการ/กิจกรรมได้	อนุมัติ	วางแผนงานตามตัวชี้วัด	วางแผนใช้จ่ายงบประมาณ	รายงานความก้าวหน้า	รายงานผลงานตามตัวชี้วัด	รายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ	บริหารตัวชี้วัด	จัดทำแผนงาน	บริหารค่าตาม	กำหนดรอบการรายงาน
<input checked="" type="checkbox"/> นาย	ผู้ไม่ทั่วไป	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> กน	ผู้ไม่ทั่วไป	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> กน	ผู้ไม่ทั่วไป	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> กน	ผู้ไม่ทั่วไป	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> เกีย	ผู้ไม่ทั่วไป	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> ขน	ผู้ดูแลระบบย่อย	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> อษ	ผู้ไม่ทั่วไป	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> อษ	ผู้ดูแลระบบย่อย	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[บันทึก](#)

รูปที่ 14 แสดงหน้าจอบริหารสิทธิ์



บทที่ 4 บริหารงานโครงการ

การบริหารงานโครงการ สำหรับผู้ดูแลระบบย่อย (สทสรณ์จังหวัด) สามารถบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ได้แก่ การวางแผนการดำเนินงานโครงการ การเรียกดูข้อมูลโครงการ การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และการเรียกดูข้อมูลของกิจกรรมย่อย

4.1 วางแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ

4.1.1 การวางแผนการดำเนินงานโครงการ

1. คลิกเมนู **บริหารงานโครงการ >>> วางแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ** ดังรูป

ระบบบริหารจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ปีงบประมาณ : 2565
สวัสดิ์ : คุณผู้ดูแลจังหวัด (ผู้ดูแลระบบย่อย)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
หน้าหลัก | แก้ไขข้อมูลส่วนตัว | ออกจากระบบ

ระบบเครื่องมือกลาง งาน/โครงการ/กิจกรรม **บริหารงานโครงการ** รายงานความก้าวหน้า รายงาน (1) รายงาน (2)

งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่คุณเกี่ยวข้อง

ตั้งค่าการแจ้งเตือน-กำหนดส่งรายงาน

ลำดับที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	ระหว่างวันที่	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานของท่านได้รับโอนแล้ว	การแจ้งเตือน
1	แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทดสอบ (กำลังดำเนินการ)	01/10/2564 - 30/09/2565	1	500,000	2,000.00	

หน้า [1] แสดงทั้งหมด

รูปที่ 15 แสดงหน้าหลักระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ

2. ระบบแสดงหน้าจอวางแผนงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม **ค้นหา**

วางแผนงาน/โครงการ


พบทั้งหมด 15 งาน/โครงการ





ลำดับที่	งาน/โครงการ	หน่วยงานผู้ดำเนินการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	วางแผนแล้ว	แผนงานที่
1	แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	78 หน่วยงาน • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ดูทั้งหมด	01/10/2563 - 30/09/2564	9	246,466,800	242,656,125	2

รูปที่ 16 แสดงหน้าจอวางแผนงาน/โครงการ

3. ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ปุ่ม  ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ

วางแผนงาน/โครงการ

พบทั้งหมด 2 งาน/โครงการ 

ลำดับที่	งาน/โครงการ	หน่วยงานผู้ดำเนินการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	วางแผนแล้ว	แผนงานที่	
1	โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ]	79 หน่วยงาน • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกระบี่ • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกาญจนบุรี • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกำแพงเพชร • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดขอนแก่น ดูทั้งหมด	01/10/2563 - 30/09/2564	7	3,715,700	543,000	5	  3
2	โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายนอกเหนือจากโครงการเสริมสร้าง]	77 หน่วยงาน • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกระบี่ • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกาญจนบุรี • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกำแพงเพชร • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดขอนแก่น ดูทั้งหมด	01/10/2563 - 30/09/2564	5	0	0	5	 
รวมทุกงาน/โครงการในหน้า 1					3,715,700	543,000	บาท	

หน้าที่ [1] แสดงทั้งหมด

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะโครงการหรือกิจกรรม ที่อนุมัติแล้วเท่านั้น

รูปที่ 17 แสดงหน้าจอวางแผนงาน/โครงการ



4. ระบบแสดงหน้าจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงานดังรูป

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน: แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
 ผลผลิต: สทศรณและกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
 กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์
 กิจกรรมรอง: พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป

โดยหน่วยงาน :

หน่วยงานที่ทำการวางแผน : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี

ตัวชี้วัดงาน
 แผนการดำเนินงาน/โครงการ : พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป

1. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผู้เข้ารับการพัฒนาระบบการเรียนรู้ได้รับการส่งเสริมความรู้ 900 คน ได้รับค่าเป้าหมาย = 45 คน

ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	สะสม
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผู้เข้ารับการพัฒนาระบบการเรียนรู้มีแผนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้หลังการฝึกอบรม 100.00 ร้อยละ ได้รับค่าเป้าหมาย = 100.00 ร้อยละ

ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	สะสม
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	8.33

กิจกรรมงาน

1. แผนการดำเนินงานกิจกรรม : โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา"

1.1. จัดฝึกอบรม/พัฒนาระบบการเรียนรู้ 20 รุ่น ได้รับค่าเป้าหมาย = 1 รุ่น

ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	สะสม
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1

1.2. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม "เพศชาย" 450 คน ได้รับค่าเป้าหมาย = 0 คน

รูปที่ 18 แสดงหน้าจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน



5. กรอกข้อมูลการวางแผนการดำเนินงานลงไป เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก

หน่วยงานที่ทำการวางแผน : สำนักงานสทสรณ์จังหวัดลพบุรี

1. แผนการดำเนินงานงาน/โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

1.1. พื้นที่แปลงใหญ่ที่ดำเนินการในพื้นที่แปลงเกษตรกร 2,000.00 แปลง ได้รับความเป้าหมาย = 0.00 แปลง

ส.ค.	พ.ม.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00

2. แผนการดำเนินงานกิจกรรม : สนับสนุนการดำเนินงานแปลงใหญ่แบบบูรณาการตามเป้าหมายกลุ่มส่งเสริมการเกษตร

2.2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิต การจำหน่าย และการบริหารจัดการร่วมกับใกล้เคียง... 0 ราย ได้รับความเป้าหมาย = 0 ราย

ส.ค.	พ.ม.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
0.00	0.00	578.00	610.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00

2.3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อผลิต การจำหน่าย และการบริหารจัดการร่วมกับใกล้เคียง... 0.70 ราย ได้รับความเป้าหมาย = 0.00 ราย

ส.ค.	พ.ม.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
0.00	0.00	578.00	610.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00

2.6. ส่งเสริมการรณรงค์การลดค่า/แยกค่าใช้จ่าย และเชื่อมโยงเครือข่าย โดยการจัดทำ... 0.00 แปลง ได้รับความเป้าหมาย = 0.00 แปลง

ส.ค.	พ.ม.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
0.00	0.00	8.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00

2.7. แปลงใหญ่ที่มีการลดค่าสินค้าเกษตรมูลค่า 0.00 แปลง ได้รับความเป้าหมาย = 0.00 แปลง

ส.ค.	พ.ม.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

2.8. แปลงใหญ่ที่มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU สินค้าเกษตรมูลค่า [แปลงในเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร] 0.00 แปลง ได้รับความเป้าหมาย = 0.00 แปลง

ส.ค.	พ.ม.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.12. ผลผลิตแปลงใหญ่ที่จำหน่ายได้จริง [แปลงในเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร] 0.00 ก.ก. ได้รับความเป้าหมาย = 0.00 ก.ก.

ส.ค.	พ.ม.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.13. ผลผลิตแปลงใหญ่ที่จำหน่ายได้จริง [แปลงในแปลงใหญ่] 0.00 บาท ได้รับความเป้าหมาย = 0.00 บาท

ส.ค.	พ.ม.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.14. ผลผลิตแปลงใหญ่ที่จำหน่ายได้จริง [แปลงในแปลงใหญ่] 0.00 แปลง ได้รับความเป้าหมาย = 0.00 แปลง

ส.ค.	พ.ม.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.15. ผลผลิตแปลงใหญ่ที่จำหน่ายได้จริง [แปลงในแปลงใหญ่] 0.00 ก.ก. ได้รับความเป้าหมาย = 0.00 ก.ก.

ส.ค.	พ.ม.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. แผนการดำเนินงานกิจกรรม : สนับสนุน สนับสนุนเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรให้มีขนาดนาแปลงใหญ่

3.1. เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตในแปลงใหญ่ [เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมแปลงใหญ่] 0 แปลง ได้รับความเป้าหมาย = 0 แปลง

ส.ค.	พ.ม.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00

3.2. เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตในแปลงใหญ่ [เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมแปลงใหญ่] 0 แปลง ได้รับความเป้าหมาย = 0 แปลง

ส.ค.	พ.ม.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00

3.3. ผลการรวบรวมผลผลิตในแปลงใหญ่ที่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรอื่น 0.00 บาท ได้รับความเป้าหมาย = 0.00 บาท

ส.ค.	พ.ม.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.4. ผลการรวบรวมผลผลิตในแปลงใหญ่ที่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรอื่น 0 ราย ได้รับความเป้าหมาย = 0 ราย

ส.ค.	พ.ม.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.6. เป็นแหล่งให้บริการเชิงวิชาการแก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ... 0 ราย ได้รับความเป้าหมาย = 0 ราย

ส.ค.	พ.ม.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00

3.7. เป็นแหล่งให้บริการเชิงวิชาการแก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ... 0.00 แปลง ได้รับความเป้าหมาย = 0.00 แปลง

ส.ค.	พ.ม.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00

3.8. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมแปลงใหญ่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยโครงการ... 0 แปลง ได้รับความเป้าหมาย = 0 แปลง

ส.ค.	พ.ม.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.9. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมแปลงใหญ่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยโครงการ... 0.00 แปลง ได้รับความเป้าหมาย = 0.00 แปลง

ส.ค.	พ.ม.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.10. ส่งเสริม สนับสนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมแปลงใหญ่ในปีงบประมาณ พ.ศ.256... 0 แปลง ได้รับความเป้าหมาย = 0 แปลง

ส.ค.	พ.ม.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

3.11. ส่งเสริม สนับสนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมแปลงใหญ่ในปีงบประมาณ พ.ศ.256... 0.00 แปลง ได้รับความเป้าหมาย = 0.00 แปลง

ส.ค.	พ.ม.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

บันทึก

5

โครงการกลุ่ม โครงการแปลงใหญ่

รูปที่ 19 แสดงหน้าจอวางแผนการดำเนินงานโครงการ



4.1.2 การเรียกดูข้อมูลของโครงการ

1. ระบบแสดงหน้าจอวางแผนงาน/โครงการตั้งรูป กรอกชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ชื่อของโครงการเพื่อดูรายละเอียด

วางแผนงาน/โครงการ

พบทั้งหมด 13 งาน/โครงการ

ลำดับที่	งาน/โครงการ	หน่วยงานผู้ดำเนินการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	วางแผนแล้ว	แผนงานที่	
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	61 หน่วยงาน <ul style="list-style-type: none"> สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกระบี่ สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสทสรณ์จังหวัดขอนแก่น ดูทั้งหมด	01/10/2562 - 30/09/2563	4	2,943,200	2,735,900	5	
2	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	78 หน่วยงาน <ul style="list-style-type: none"> สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกระบี่ สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสทสรณ์จังหวัดขอนแก่น ดูทั้งหมด	01/10/2562 - 30/09/2563	2	1,957,800	1,957,800	3	

รูปที่ 20 แสดงหน้าจอหน้าวางแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม



3. ระบบจะแสดงข้อมูลทั่วไปของโครงการขึ้นมาดังรูป ในส่วนนี้สามารถคลิกดูข้อมูลอื่นๆ ได้ เช่น ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ข้อมูลการกำหนดเป้าหมายให้หน่วยงาน, ข้อมูลจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน, ข้อมูลอนุมัติโครงการ, สถานะการวางแผน, ผลการดำเนินงาน, สถานะแผนเบิกจ่าย, ผลการเบิกจ่าย, ปิดงาน/โครงการ

ข้อมูลทั่วไป	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน	จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน	อนุมัติโครงการ	สถานะการวางแผน	ผลการดำเนินงาน	สถานะแผนเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ปิดงาน/โครงการ
รายละเอียดของงาน/โครงการ									
ชื่องาน/โครงการ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร								
วัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ								
สถานะการใช้งาน	กำลังดำเนินการ								
เจ้าของโครงการ									
หมายเหตุ									
ระยะเวลา									
เริ่มต้น	01/10/2562								
สิ้นสุด	30/09/2563								
โครงการ ปีงบประมาณ 2563									
โครงการนี้ผูกภายใต้	แผนงาน: แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลผลิต: โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล								
ชื่อตัวชี้วัด	ประเภทเป้าหมาย	เป้าหมาย	หน่วยนับ						
สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	เชิงปริมาณ	0.00	ราย						
บูรณาการร่วมกับระหว่างหน่วยงาน และติดตามการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินฯ	เชิงปริมาณ	166.00	พื้นที่						
สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	เชิงปริมาณ	22.00	พื้นที่						
ข้อมูลกิจกรรม ภายใต้งาน/โครงการ									
ลำดับที่	กิจกรรม	ระหว่างวันที่	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ					
1.	บูรณาการงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่โครงการตามนโยบายรัฐบาล	01/10/2562 30/09/2563	6	1,923,100					
2.	เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ นำข้อมูลจากแบบสรุปรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้คทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	01/10/2562 30/09/2563	7	0					
3.	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล	01/10/2562 30/09/2563	2	972,000					
4.	การจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกที่ได้รับการอบรมสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่	01/10/2562 30/09/2563	4	0					
งบประมาณ									
ประเภทงบ	งบประมาณ								
งบบุคลากร	0.00 บาท								
งบดำเนินงาน	2,943,200.00 บาท								
งบลงทุน	0.00 บาท								
งบเงินอุดหนุน	0.00 บาท								
งบรายจ่ายอื่น	0.00 บาท								
งบกลาง	0.00 บาท								
งบประมาณทั้งหมด	2,943,200.00 บาท								
รูปแบบในการวางแผนเบิกจ่าย : รายเดือน									

รูปที่ 21 แสดงหน้าจอข้อมูลทั่วไปของงาน/โครงการ



4.1.3 การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

1. ระบบแสดงหน้าจอวางแผนงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ปุ่ม ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ

วางแผนงาน/โครงการ

พบทั้งหมด 2 งาน/โครงการ

ลำดับที่	งาน/โครงการ	หน่วยงานผู้ดำเนินการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	วางแผนแล้ว	แผนงานที่	
1	โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ]	79 หน่วยงาน • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกระบี่ • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกาญจนบุรี • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกำแพงเพชร • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดขอนแก่น ดูทั้งหมด	01/10/2563 - 30/09/2564	7	3,715,700	543,000	5	
2	โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายนอกเหนือจากโครงการเสริมสร้าง]	77 หน่วยงาน • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกระบี่ • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกาญจนบุรี • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกำแพงเพชร • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดขอนแก่น ดูทั้งหมด	01/10/2563 - 30/09/2564	5	0	0	5	
รวมทุกงาน/โครงการในหน้า 1					3,715,700	543,000	บาท	

หน้าที่ [1] [แสดงทั้งหมด](#)

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะโครงการหรือกิจกรรม ที่อนุมัติแล้วเท่านั้น

รูปที่ 22 แสดงหน้าจอหน้าวางแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม

3. ระบบแสดงหน้าจอเลือกวางแผนงบประมาณดังรูป คลิกปุ่ม วางแผน ตามหมวดงบประมาณที่ได้รับโอนแล้ว

วางแผนงาน/โครงการ: โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

เลือกงบประมาณที่ต้องการวางแผนการใช้จ่าย

โดยหน่วยงาน :

ลำดับที่	ชื่องบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับโอนแล้ว	สถานะ	งบประมาณที่วางแผนแล้ว	เลือก
1	งบดำเนินงาน	207,900.00	207,900.00	วางแผนแล้ว	207,900.00	<input type="button" value="วางแผน"/>
	รวม	207,900.00	207,900.00	บาท		

รูปที่ 23 แสดงหน้าจอวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ



4. ระบบแสดงหน้าจอวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการรายเดือนดังรูป กรอกข้อมูลการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณลงไป เมื่อวางแผนเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม **บันทึก**

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ : งาน/โครงการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ : 01/10/2560 - 30/09/2561
หน่วยงานที่ทำการวางแผน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
งบดำเนินงานที่ได้รับ = 207,900.00 บาท
รูปแบบในการวางแผนใช้จ่าย : รายเดือน

ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
0.00	0.00	196,700.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	207,900.00

บันทึก

รูปที่ 24 แสดงหน้าจอวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการรายเดือน

5. เมื่อบันทึกการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว ระบบจะแสดงสถานะว่า วางแผนแล้ว สามารถดูข้อมูลการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณได้โดยคลิกปุ่ม

วางแผนงาน/โครงการ:โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

เลือกงบประมาณที่ต้องการวางแผนการใช้จ่าย

โดยหน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	ชื่อบุคลากร	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับโอนแล้ว	สถานะ	งบประมาณที่วางแผนแล้ว	เลือก
1	งบดำเนินงาน	207,900.00	207,900.00	วางแผนแล้ว	207,900.00	วางแผน
	รวม	207,900.00	207,900.00	บาท		

โครงการที่ดูแล โครงการของหน่วยงาน

รูปที่ 25 แสดงหน้าจอข้อมูลการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณ

6. ระบบจะแสดงข้อมูลการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้บันทึกขึ้นมา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ : งาน/โครงการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ : 01/10/2560 - 30/09/2561
หน่วยงานที่ทำการวางแผน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
งบดำเนินงานที่ได้รับ = 207,900.00 บาท
รูปแบบในการวางแผนใช้จ่าย : รายเดือน

ปี 2561

ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
0.00	0.00	196,700.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	207,900.00

รูปที่ 26 แสดงหน้าจอข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

7. ในส่วนนี้สามารถบันทึกข้อมูลการโอนค่างบประมาณได้ โดยคลิกปุ่ม

วางแผนงาน/โครงการ:โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

เลือกงบประมาณที่ต้องการวางแผนการใช้จ่าย


โดยหน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	ชื่อบุคลากร	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับโอนแล้ว	สถานะ	งบประมาณที่วางแผนแล้ว	เลือก
1	งบดำเนินงาน	207,900.00	207,900.00	วางแผนแล้ว	207,900.00	วางแผน
	รวม	207,900.00	207,900.00	บาท		

โครงการที่ดูแล โครงการของหน่วยงาน

รูปที่ 27 แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการโอนค่างบประมาณ



8. กรอกข้อมูลการโอนคืบลงไป แล้วคลิกปุ่ม **บันทึก** จากนั้นรอผลการอนุมัติ กรณีที่ยังไม่ได้อนุมัติ สามารถ
ลบข้อมูลการโอนคืบงบประมาณออกได้ โดยคลิกปุ่ม 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ : งาน/โครงการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ : 01/10/2560 - 30/09/2561
หน่วยงานที่ทำการโอนคืบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
งบดำเนินงาน ที่ได้รับ = **207,900.00** บาท

จำนวนเงินที่ได้รับ:	207,900.00 บาท
จำนวนเงินที่ต้องการโอนคืบ:	<input type="text"/> บาท
รายละเอียด:	<div style="border: 1px solid gray; height: 40px;"></div>

วันที่ขอโอนคืบ	ผู้ทำรายการโอนคืบ	รายละเอียด	จำนวนเงินที่โอนคืบ	สถานะ	จัดการ
ไม่มีข้อมูล					

รูปที่ 28 แสดงหน้าจอโอนคืบงบประมาณโครงการ



4.1.4 การเรียกดูข้อมูลของกิจกรรมย่อย

1. ระบบแสดงหน้าจอวางแผนงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่จำนวนกิจกรรมของโครงการ

วางแผนงาน/โครงการ								
ลำดับที่	งาน/โครงการ	หน่วยงานผู้ดำเนินการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	วางแผนแล้ว	แผนงานที่	
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	61 หน่วยงาน • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกระบี่ • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกาญจนบุรี • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกำแพงเพชร • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดขอนแก่น ดูทั้งหมด	01/10/2562 - 30/09/2563	4	3,200	2,735,900	5	

รูปที่ 29 แสดงหน้าจอวางแผนงาน/โครงการ

3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายชื่อกิจกรรม คลิกที่ชื่อของกิจกรรมเพื่อเรียกดูข้อมูลที่ต้องการ

วางแผนงาน/โครงการ > โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร								
ลำดับที่	กิจกรรม	หน่วยงานผู้ดำเนินการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ	วางแผนแล้ว	แผนงานที่	
1	บูรณาการงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่โครงการตามนโยบายรัฐบาล	61 หน่วยงาน • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกระบี่ • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกาญจนบุรี • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกำแพงเพชร • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดขอนแก่น ดูทั้งหมด	01/10/2562 - 30/09/2563	-	1,923,100	0	5	
2	เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ นำข้อมูลจากแบบสรปรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้คตทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	61 หน่วยงาน • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกระบี่ • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกาญจนบุรี • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกำแพงเพชร • สำนักงานสทสรณ์จังหวัดขอนแก่น ดูทั้งหมด	01/10/2562 - 30/09/2563	-	0	0	5	

รูปที่ 30 แสดงหน้าจอรายชื่อกิจกรรม



4. ระบบจะแสดงข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม ในส่วนนี้สามารถคลิกดูข้อมูลอื่นๆ ได้ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ข้อมูลการกำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน, ข้อมูลจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน, ข้อมูลอนุมัติโครงการ, สถานะการวางแผน, ผลการดำเนินงาน, สถานะแผนเบิกจ่าย, ผลการเบิกจ่าย

ข้อมูลทั่วไป	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน	จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน	อนุมัติโครงการ	สถานะการวางแผน	ผลการดำเนินงาน	สถานะแผนเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย
รายละเอียดของกิจกรรม								
ชื่อกิจกรรม	กิจกรรมบูรณาการงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่โครงการตามนโยบายรัฐบาล							
วัตถุประสงค์								
สถานะการใช้งาน	กำลังดำเนินการ							
เจ้าของโครงการ								
หมายเหตุ								
ระยะเวลา								
เริ่มต้น	01/10/2562							
สิ้นสุด	30/09/2563							
กิจกรรม มีงบประมาณ 2563								
กิจกรรมนี้อยู่ภายใต้	<p>แผนงาน: แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก</p> <p>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :</p> <p>ผลผลิต: โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร</p> <p>กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล</p> <p>งาน/โครงการ: โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร</p>							
	ชื่อปริมาณงาน	ประเภทเป้าหมาย	เป้าหมาย	หน่วยนับ				
	จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหน่วยงานภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระดับจังหวัด	เชิงปริมาณ	183.00	ครั้ง				
	การจัดประชุมครั้งที่ 1 กำหนดเป้าหมาย/แผนปฏิบัติการรายหน่วยงาน	เชิงปริมาณ	1,830.00	ราย				
	การจัดประชุมครั้งที่ 2 ติดตามผลการดำเนินงาน	เชิงปริมาณ	1,830.00	ราย				
	การจัดประชุมครั้งที่ 3 สรุปผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/กำหนดแผนระยะต่อไป	เชิงปริมาณ	1,830.00	ราย				
	แนะนำ ส่งเสริม บูรณาการรวมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการ ดชช. จำนวนพื้นที่ ดชช.	เชิงปริมาณ	166.00	พื้นที่				
	แนะนำ ส่งเสริม บูรณาการรวมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการ ดชช. จำนวนครั้งที่ปฏิบัติงาน	เชิงปริมาณ	1,660.00	ครั้ง				
งบประมาณ								
	ประเภทงบ	งบประมาณ						
	งบบุคลากร	0.00 บาท						
	งบดำเนินงาน	1,923,100.00 บาท						
	งบลงทุน	0.00 บาท						
	งบเงินอุดหนุน	0.00 บาท						
	งบรายจ่ายอื่น	0.00 บาท						
	งบกลาง	0.00 บาท						
	งบประมาณทั้งหมด	1,923,100.00 บาท						
รูปแบบในการวางแผนใช้จ่าย : รายเดือน								



รูปที่ 31 แสดงหน้าจอข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม



4.2 ตั้งค่าการแจ้งเตือน – กำหนดส่งรายงาน

1. คลิกเมนู บริหารงานโครงการ >>> ตั้งค่าการแจ้งเตือน – กำหนดส่งรายงาน ดังรูป

ระบบบริหารจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ปีงบประมาณ : 2564
สวัสดิ์ : คุณ (ผู้ดูแลระบบย่อย) สำนักงาน สทกรณจังหวัด
หน้าหลัก | แก้ไขข้อมูลส่วนตัว | ออกจากระบบ

ระบบเครื่องมือกลาง งาน/โครงการ/กิจกรรม **บริหารงานโครงการ** รายงานความก้าวหน้า ระบบสืบค้นข้อมูล/ ระบบรายงาน

วางแผนงาน/โครงการ

วางแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้ จ่ายงบประมาณของ โครงการ

พบทั้งหมด 9 งาน/โครงการ

ลำดับที่	งาน/โครงการ	หน่วยงานผู้จัด	จัดกิจกรรม	จำนวนกิจกรรม	วางแผนแล้ว	แผนงานที่
1	แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและ		9	246,466,800	242,656,125	2

ตั้งค่าการแจ้งเตือน-กำหนดส่งรายงาน

รูปที่ 32 แสดงหน้าหลักระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ

2. ระบบจะแสดงหน้าจอตั้งค่าการแจ้งเตือน – กำหนดส่งรายงาน งาน/โครงการ ดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
3. ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ปุ่ม เพื่อเรียกดูกำหนดส่งรายงาน

ตั้งค่าการแจ้งเตือน-กำหนดส่งรายงาน งาน/โครงการ

พบทั้งหมด 2 งาน/โครงการ ค้นหา

ลำดับที่	งาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	แผนงานที่
1	โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ]	79 หน่วยงาน •สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ •สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี •สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ •สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร •สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ดูทั้งหมด	01/10/2563 - 30/09/2564	7	5
2	โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายนอกเหนือจากโครงการเสริมสร้าง]	77 หน่วยงาน •สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ •สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี •สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ •สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร •สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ดูทั้งหมด	01/10/2563 - 30/09/2564	5	5

หน้าที่ [1] แสดงทั้งหมด


หมายเหตุ : 1. แสดงเฉพาะโครงการหรือกิจกรรม ที่อนุมัติแล้วเท่านั้น
2. สำหรับผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร หรือ เจ้าของโครงการเท่านั้น

รูปที่ 33 แสดงหน้าจอตั้งค่าการแจ้งเตือน – กำหนดส่งรายงาน งาน/โครงการ/ กิจกรรม



4. ระบบจะแสดงหน้าจอกำหนดส่งรายงาน งาน/โครงการดังรูป คลิกที่ Check box ตามที่ต้องการเพื่อกำหนดการแจ้งเตือน

โครงการโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน]


 กำหนดส่งรายงานความก้าวหน้า

ตัวชี้วัด/งาน/กิจกรรม รายเดือน


รายงานผลภายใน วันที่ 25 เดือนถัดไป

ตัวชี้วัด/งาน/กิจกรรม รายไตรมาส

รายงานผลภายใน สิ้นไตรมาสปัจจุบัน

 กำหนดส่งรายงานเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานผลภายใน สิ้นเดือนปัจจุบัน

 ตั้งค่าการแจ้งเตือน

เปิด/ปิด

<input type="checkbox"/>	เรื่องที่ทำการแจ้งเตือน
<input type="checkbox"/>	ตัวชี้วัดต่ำกว่าค่าที่วางแผนไว้ หลังจากวันที่
<input type="checkbox"/>	% ความคืบหน้าของโครงการ ต่ำกว่า - % หลังจากวันที่
<input type="checkbox"/>	เริ่มเดือนการส่งรายงานความก้าวหน้า ก่อนถึงกำหนดส่งรายงาน 10 วัน

รูปที่ 34 แสดงหน้าจอกำหนดส่งรายงาน งาน/โครงการ



บทที่ 5 รายงานความก้าวหน้า

5.1 รายงานผลงาน/โครงการ/กิจกรรม

5.1.1 การบริหารปัจจัยเสี่ยง งาน/โครงการ/กิจกรรม

1. คลิกเมนู รายงานความก้าวหน้า >> รายงานผลงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังรูป

ระบบบริหารจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ปีงบประมาณ : 2565
 สวัสดิ์ : คุณผู้ดูแลจังหวัด (ผู้ดูแลระบบย่อย)
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
 หน้าหลัก | แก้ไขข้อมูลส่วนตัว | ออกจากระบบ

ระบบเครื่องมือกลาง งาน/โครงการ/กิจกรรม บริหารงานโครงการ **รายงานความก้าวหน้า** รายงาน (1) รายงาน (2)

ตั้งค่าการแจ้งเตือนกำหนดส่งรายงาน

พบทั้งหมด 1 งาน/โครงการ

ลำดับที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	แผนงานที่	
1	แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทดสอบ	30 หน่วยงาน •สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ •สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี •สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ •สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร •สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	01/10/2564 - 30/09/2565	1	1	

รูปที่ 35 แสดงหน้าหลักระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ

5.1.1.1 การเรียกดูปัจจัยเสี่ยง

1. ระบบแสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ปุ่ม รายชื่อของโครงการที่ต้องการ

รายงานผลงาน/โครงการ

กระดานข้อความส่วนกลาง

พบทั้งหมด 9 งาน/โครงการ

งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนงานที่
				ทั้งหมด	ผลการเบิกจ่าย	% ทั้งปี	
1. แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	01/10/2563 - 30/09/2564	9	 57.82%	3,300,700	1,980,527	 60%	2
2. โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน]	01/10/2563 - 30/09/2564	7	 50.00%	4,200	1,050	 25%	5

รูปที่ 36 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการ



3. ระบบจะแสดงหน้าจอปัจจัยเสี่ยงดังรูป

ปัจจัยเสี่ยง	รายงานความคืบหน้า
<p>ปัจจัยเสี่ยง โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ]</p>	
<p>ปัจจัยที่ 1</p> <p style="text-align: center;">เรื่อง : ทดสอบ ความร้ายแรง : กลาง วงรอบในการรายงาน : รายไตรมาส สถานะปัจจุบัน : ปิด - ไม่มีความเสี่ยงแล้ว</p>	

รูปที่ 37 แสดงหน้าจอปัจจัยเสี่ยงงาน/ โครงการ

5.1.1.2 การรายงานความคืบหน้าในการจัดการปัจจัยเสี่ยง

- ระบบแสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
- ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ปุ่ม รายชื่อของโครงการที่ต้องการ

รายงานผลงาน/โครงการ							
กระดานข้อความส่วนกลาง		พบทั้งหมด 9 งาน/โครงการ <input type="text"/>					
งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนงานที่
				ทั้งหมด	ผลการเบิกจ่าย	% ทั้งปี	
1. แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของ สทสรณ์/กลุ่มเกษตรกร	01/10/2563 - 30/09/2564	9	57.82%	3,300,700	1,980,527	60%	2
2. โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ]	01/10/2563 - 30/09/2564	7	50.00%	4,200	1,050	25%	5


รูปที่ 38 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/ โครงการ



3. ระบบจะแสดงหน้าจอปัจจัยเสี่ยงดังรูปคลิกที่แท็บ รายงานความคืบหน้า

ปัจจัยเสี่ยง	รายงานความคืบหน้า
<p>ปัจจัยเสี่ยง โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ]</p> <p>ปัจจัยที่ 1</p> <p style="text-align: center;">เรื่อง : ทดสอบ ความร้ายแรง : กลาง วงรอบในการรายงาน : รายไตรมาส สถานะปัจจุบัน : ปิด - ไม่มีความเสี่ยงแล้ว</p>	

รูปที่ 39 แสดงหน้าจอปัจจัยเสี่ยงงาน/โครงการ

4. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานความคืบหน้าในการจัดการปัจจัยเสี่ยงดังรูป คลิกที่ปุ่ม  เพื่อรายงานปัจจัยเสี่ยง รายเดือน หรือรายไตรมาส

ปัจจัยเสี่ยง	รายงานความคืบหน้า																																				
<p>รายงานความคืบหน้าในการจัดการปัจจัยเสี่ยง : โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ]</p> <p>วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ : 01/10/2563 - 30/09/2564</p>																																					
<p>ปัจจัยเสี่ยง รายเดือน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>เดือน / ปี</th> <th>รายงานผล</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ต.ค. 63</td><td></td></tr> <tr><td>พ.ย. 63</td><td></td></tr> <tr><td>ธ.ค. 63</td><td></td></tr> <tr><td>ม.ค. 64</td><td></td></tr> <tr><td>ก.พ. 64</td><td></td></tr> <tr><td>มี.ค. 64</td><td></td></tr> <tr><td>เม.ย. 64</td><td></td></tr> <tr><td>พ.ค. 64</td><td></td></tr> <tr><td>มิ.ย. 64</td><td></td></tr> <tr><td>ก.ค. 64</td><td></td></tr> <tr><td>ส.ค. 64</td><td></td></tr> <tr><td>ก.ย. 64</td><td></td></tr> </tbody> </table>	เดือน / ปี	รายงานผล	ต.ค. 63		พ.ย. 63		ธ.ค. 63		ม.ค. 64		ก.พ. 64		มี.ค. 64		เม.ย. 64		พ.ค. 64		มิ.ย. 64		ก.ค. 64		ส.ค. 64		ก.ย. 64		<p>ปัจจัยเสี่ยง รายไตรมาส</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ไตรมาสที่</th> <th>รายงานผล</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td></tr> </tbody> </table>	ไตรมาสที่	รายงานผล	1		2		3		4	
เดือน / ปี	รายงานผล																																				
ต.ค. 63																																					
พ.ย. 63																																					
ธ.ค. 63																																					
ม.ค. 64																																					
ก.พ. 64																																					
มี.ค. 64																																					
เม.ย. 64																																					
พ.ค. 64																																					
มิ.ย. 64																																					
ก.ค. 64																																					
ส.ค. 64																																					
ก.ย. 64																																					
ไตรมาสที่	รายงานผล																																				
1																																					
2																																					
3																																					
4																																					

รูปที่ 40 แสดงหน้าจอรายงานความคืบหน้าในการจัดการปัจจัยเสี่ยง



5. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานความคืบหน้าในการจัดการปัจจัยเสี่ยงดังรูป กรอกรายงานผลการจัดการปัจจัยเสี่ยง, เลือกรายความร้ายแรง ณ ปัจจุบัน แล้วคลิกปุ่ม **บันทึก**

ปัจจัยเสี่ยง	รายงานความคืบหน้า
<p>รายงานความคืบหน้า ในการจัดการปัจจัยเสี่ยง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563</p> <p>งาน/โครงการ : โครงการทดสอบโครงการเลื่อมปี</p> <p>หน่วยงานที่ทำการรายงานผล : สำนักงานสทสรณ์จังหวัดมุกดาหาร</p>	
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p>ปัจจัยที่ 1</p> <p>เรื่อง : ทดสอบ</p> <p>ความร้ายแรง : กลาง</p> <p>รายงานผลการจัดการ :</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div> <p>ความร้ายแรง ณ ปัจจุบัน: ต่ำ</p> </div>	
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;">บันทึก</div>	

รูปที่ 41 แสดงหน้าจอรายงานความคืบหน้าในการจัดการปัจจัยเสี่ยง

5.1.2 กระดานข้อความ

- ระบบแสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกรายชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
- ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหา กรณีที่ต้องการส่งข้อความติดตาม งาน/โครงการ/ กิจกรรม ให้คลิกปุ่ม ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ หากต้องการส่งข้อความส่วนกลาง ให้คลิกที่ **กระดานข้อความส่วนกลาง**

รายงานผลงาน/โครงการ								
งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนงานที่	
				ทั้งหมด	ผลการเบิกจ่าย	% หนึ่งปี		
1. แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของ สทสรณ์/กลุ่มเกษตรกร	01/10/2563 - 30/09/2564	9	 57.82%	3,300,700	1,980,527	 60%	2	
2. โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน]	01/10/2563 - 30/09/2564	7	 50.00%	4,200	1,050	 25%	5	

รูปที่ 42 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการ



3. ระบบจะแสดงหน้าจอกระดานข้อความส่วนกลาง คลิกปุ่ม **ส่งข้อความติดตาม**

หัวข้อ	เจ้าของหัวข้อ	ตอบ	อ่าน	ตอนล่าสุด
ยังไม่มีหัวข้อ				

รูปที่ 43 แสดงหน้าจอกระดานข้อความส่วนกลาง

4. กรอกรายละเอียดการส่งข้อความติดตามลงไป แล้วคลิกปุ่ม **บันทึก**

หัวข้อ :

รายละเอียด :

แนบไฟล์ : No file chosen

ส่งให้ : เลือกหน่วยงาน

รูปที่ 44 แสดงหน้าจอส่งข้อความติดตาม



5.1.3 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

1. ระบบแสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ปุ่ม ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ

รายงานผลงาน/โครงการ

กระดานข้อความส่วนกลาง

พบทั้งหมด 9 งาน/โครงการ

งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนงานที่	
				ทั้งหมด	ผลการเบิกจ่าย	% หนึ่งปี		
1. แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของ สทสรณ์/กลุ่มเกษตรกร	01/10/2563 - 30/09/2564	9	57.82%	3,300,700	1,980,527	60%	2	
2. โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ]	01/10/2563 - 30/09/2564	7	50.00%	4,200	1,050	25%	5	

รูปที่ 45 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการ

3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังรูป คลิกปุ่ม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ งาน/ กิจกรรม รายเดือน หรือรายไตรมาส

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด : โครงการทดสอบโครงการเสมือนปี

วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ : 01/10/2563 - 31/01/2565

ตัวชี้วัด/งาน/กิจกรรม รายเดือน

เดือน / ปี	รายงานผล	หมายเหตุ
ต.ค. 63		ขณะนี้เลยกำหนดส่งรายงานแล้ว
พ.ย. 63		ขณะนี้เลยกำหนดส่งรายงานแล้ว
ธ.ค. 63		ขณะนี้เลยกำหนดส่งรายงานแล้ว
ม.ค. 64		ขณะนี้เลยกำหนดส่งรายงานแล้ว
ก.พ. 64		ขณะนี้เลยกำหนดส่งรายงานแล้ว
มี.ค. 64		ขณะนี้เลยกำหนดส่งรายงานแล้ว
เม.ย. 64		ขณะนี้เลยกำหนดส่งรายงานแล้ว
พ.ค. 64		ขณะนี้เลยกำหนดส่งรายงานแล้ว
มิ.ย. 64		รายงานได้ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2564
ก.ค. 64		ยังไม่ถึงกำหนดส่งรายงาน
ส.ค. 64		ยังไม่ถึงกำหนดส่งรายงาน
ก.ย. 64		ยังไม่ถึงกำหนดส่งรายงาน

รูปที่ 46 แสดงหน้าจอรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด



4. กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดลงไป แล้วคลิกปุ่ม บันทึก

แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบรายงานรวมเดือน ตามคำอธิบายที่กองแผนงานแจ้ง)

แผนงาน: แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
เป็นแผนงานภายใต้โครงการส่วนงาน :
โครงการ: test รวม
โดยหน่วยงาน : [สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกาญจนบุรี]

ประจำเดือน มิถุนายน 2561
หน่วยงานที่ทำการรายงานผล : สำนักงานสทสรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
กำหนดส่งรายงานภายในวันที่ : 28 มิ.ย. 2561

ตัวชี้วัดงาน

ผลการดำเนินงานโครงการ : test รวม

1. test ตัวชี้วัด 7 ครั้ง
ได้ค่าเป้าหมาย = 0

หน่วย	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	สะสม
แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
จริง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

กิจกรรมงาน

1. ผลการดำเนินงานกิจกรรม : test1

1.1. ทดสอบ 8 คน
ได้ค่าเป้าหมาย = 8

หน่วย	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	สะสม
แผน	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	8
จริง	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2

1.2. ฆ่าตัวได้ 5 ตัว
ได้ค่าเป้าหมาย = 5 (ข้อนี้ยังค้นคว้าแผน... หากไม่ได้วาง จะหาค่าเฉลี่ยได้)

หน่วย	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	สะสม
แผน	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	5
จริง	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2

1.3. ผลผล 10.00 ลคน
ได้ค่าเป้าหมาย = 10.00 (ข้อนี้ยังค้นคว้าแผน... หากไม่ได้วาง จะหาค่าเฉลี่ยได้)

หน่วย	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	สะสม
แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00
จริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

กิจกรรมงาน

2. ผลการดำเนินงานกิจกรรม : test 3

กิจกรรมงาน

3. ผลการดำเนินงานกิจกรรม : test สถานะปลายเปิด 2

3.1. ปริมาณ 6 ครั้ง
ได้ค่าเป้าหมาย = 0

หน่วย	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	สะสม
แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
จริง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ค่าการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
test การเก็บค่าการเปลี่ยนแปลง * :

ค่าการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด * :

เอกสารประกอบการรายงานงาน
เอกสาร
Choose File No file chosen



หมายเหตุ:
1. ระบบรองรับเฉพาะไฟล์
(.xls, .xlsx, .doc, .docx, .xls, .jpg, .gif, .png, .ppt, .pptx, .pdf, .xlsx)
เท่านั้น
2. ขนาดไฟล์ส่งไม่เกิน 10,000 Kbytes
3. ค่าส่งไฟล์นามสกุล docx, .xlsx, .pptx จำเป็นต้องใช้นิยาม
Office 2007 ขึ้นไปในกรณีเปิด

4

รูปที่ 47 แสดงหน้าจอรายงานแผน/ ผลการปฏิบัติงาน









5.1.4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ระบบแสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา 
2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ปุ่ม  ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ

รายงานผลงาน/โครงการ

กระดานข้อความส่วนกลาง

พบทั้งหมด 9 งาน/โครงการ

งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนงานที่	
				ทั้งหมด	ผลการเบิกจ่าย	% ทั้งปี		
1. แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของ สทกรม/กลุ่มเกษตรกร	01/10/2563 - 30/09/2564	9	 57.82%	3,300,700	1,980,527	 60%	2	
2. โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ]	01/10/2563 - 30/09/2564	7	 50.00%	4,200	1,050	 25%	5	

รูปที่ 48 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการ

3. ระบบจะแสดงหน้าจอเลือกงบประมาณที่ต้องการรายงานผลใช้จ่าย งาน/โครงการ ดังรูป คลิกปุ่ม รายงานผล

รายงานผลใช้จ่ายงาน/โครงการ:โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

เลือกงบประมาณที่ต้องการรายงานผลการใช้จ่าย

โดยหน่วยงาน : สำนักงานสทกรมจังหวัดมุกดาหาร

ลำดับที่	ชื่องบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับโอนแล้ว	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	%เบิกจ่าย	สถานะ	สถานะ	เลือก
1	งบดำเนินงาน	170,700.00	170,700.00	1,050.00	169,650.00	0.62	วางแผนแล้ว 1 หน่วยงาน	รายงานผลแล้ว 1 หน่วยงาน	<input type="button" value="รายงานผล"/>
	รวม	170,700.00	170,700.00	1,050.00	169,650.00	0.62			

โครงการที่ดูแล โครงการของหน่วยเรา

รูปที่ 49 แสดงหน้าจอเลือกงบประมาณที่ต้องการรายงานผลใช้จ่าย งาน/โครงการ

4. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้คลิกปุ่ม 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ งาน/โครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

แผนงาน: แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :

นี้อยู่ภายใต้ ผลผลิต: โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล













กิจกรรมรอง: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ : 01/10/2563 - 30/09/2564

หน่วยงานที่ทำการวางแผน : สำนักงานสทสรณ์จังหวัดมุกดาหาร

งบดำเนินงาน ที่ได้รับ = 170,700.00 บาท

รูปแบบในการวางแผนใช้จ่าย : รายเดือน

เดือน / ปี	สถานะ	รายงานผลใช้จ่าย	รายงานล่าสุดเมื่อ	แผน	ผล
ต.ค. 63	รายงานผลแล้ว 1 ครั้ง		21/01/2564 14:16	0.00	0.00
พ.ย. 63	รายงานผลแล้ว 1 ครั้ง		21/01/2564 14:16	0.00	0.00
ธ.ค. 63	รายงานผลแล้ว 1 ครั้ง		21/01/2564 14:16	0.00	0.00
ม.ค. 64	รายงานผลแล้ว 1 ครั้ง		21/01/2564 14:16	0.00	0.00
ก.พ. 64	รายงานผลแล้ว 1 ครั้ง		10/03/2564 09:55	4,425.00	1,050.00
มี.ค. 64	รายงานผลแล้ว 1 ครั้ง		24/03/2564 16:00	1,225.00	0.00
เม.ย. 64				51,800.00	0.00
พ.ค. 64				105,625.00	0.00
มิ.ย. 64				3,200.00	0.00
ก.ค. 64				4,425.00	0.00
ส.ค. 64				0.00	0.00
ก.ย. 64				0.00	0.00
รวม				170,700.00	1,050.00

กลับไป

รูปที่ 50 แสดงหน้าจอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ



5. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณดังรูป กรอกข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม บันทึก

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งาน/โครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ : 01/10/2563 - 30/09/2564
หน่วยงานที่ทำกรวางแผน : สำนักงานสทสรณ์จังหวัดมุกดาหาร
งบดำเนินงาน ที่ได้รับ = 170,700.00 บาท
รอบในการรายงานผลเบิกจ่าย : รายเดือน

เดือน	เม.ย. 64
แผน	51,800.00
ผล	0.00

รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน เม.ย. :

ครั้งที่เบิกจ่าย	วันที่	ประเภทข	รายการ / คำอธิบาย	จำนวนเงิน	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

หมายเหตุ

เอกสารประกอบการรายงาน


เอกสาร	วันที่	
เลือกไฟล์	ไม่มีไฟล์ใด	เรื่อง

รูปที่ 51 แสดงหน้าจอบันทึกรายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หมายเหตุ สามารถรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณได้มากกว่า 1 ครั้ง









5.1.5 รายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ

- ระบบแสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
- ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ปุ่ม  ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ

รายงานผลงาน/โครงการ

กระดานข้อความส่วนกลาง

พบทั้งหมด 9 งาน/โครงการ

งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนงานที่	
				ทั้งหมด	ผลการเบิกจ่าย	% ทั้ปี		
1. แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของ สทสรณ์/กลุ่มเกษตรกร	01/10/2563 - 30/09/2564	9	 57.82%	3,300,700	1,980,527	 60%	2	
2. โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน]	01/10/2563 - 30/09/2564	7	 50.00%	4,200	1,050	 25%	5	

รูปที่ 52 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการ


- ระบบจะแสดงหน้าจอแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ ดังรูป คลิกเลือก แบบ รายงานผล ที่ต้องการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ

1. แบบ Y56 NwP1 การเข้าปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. แบบ Y56 NwP2 ผลลัพธ์การเข้าแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3. แบบ Y56 NwP3 ผลสำเร็จของงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
4. แบบ Y56 NwP4 การตรวจการสหกรณ์

รูปที่ 53 แสดงหน้าจอรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ



4. ระบบจะแสดงหน้าจอแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ ดังรูปคลิกปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการตามแบบที่เลือก

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ

แผนงาน: แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :











ผลผลิต: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง: ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

งาน: แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

แบบ Y56 NwP1 การเข้าปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

เดือน	วันที่บันทึกล่าสุด	จัดการ
ตุลาคม		
พฤศจิกายน		
ธันวาคม		
มกราคม		
กุมภาพันธ์		
มีนาคม		
เมษายน		
พฤษภาคม		
มิถุนายน		<div style="border: 2px solid red; padding: 2px;"></div> 
กรกฎาคม		
สิงหาคม		
กันยายน		

รูปที่ 54 แสดงหน้าจอแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ



5. ระบบแสดงหน้าจอบรรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ กรอรายละเอียดให้ครบถ้วน
จากนั้นคลิกปุ่ม **บันทึกข้อมูล**

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ

แผนงาน: แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
โครงการ: test ระบบ

แบบ Y56 NwP1 การเข้าปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำเดือน **มิถุนายน**

ผลงานตามตัวชี้วัดของกิจกรรมหลัก	งานส่งเสริมทั่วไป (แห่ง)		งาน คก. พระราชดำริ (แห่ง)		งานโครงการหลวง (แห่ง)	
	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร
1. ผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริม และติดตาม การดำเนินกิจการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ผลรวมเป้าหมายเท่ากับชื่อที่ปรากฏในทะเบียน) แยกตามสถานะเป็น	รวม	0	รวม	0	รวม	0
1.1 ที่ดำเนินกิจการ	1.1	0	1.1	0	1.1	0
1.2 ที่จัดทะเบียนจัดตั้งใหม่ปี 2556	1.2	0	1.2	0	1.2	0
1.3 ที่จัดตั้งก่อนปี 2556 และยังไม่เริ่มดำเนินกิจการ	1.3	0	1.3	0	1.3	0
1.4 ที่หยุดดำเนินกิจการ	1.4	0	1.4	0	1.4	0
1.5 ที่อยู่ระหว่างกระบวนการเลิก /ชำระบัญชี (รวมถึงอยู่ระหว่างดำเนินคดี ถูกฟ้องล้มละลาย และหาข้อมูลไม่พบ)	1.5	0	1.5	0	1.5	0

ข้อ 2 กรอเฉพาะผลงานที่เกิดขึ้นในเดือนที่รายงานผลเท่านั้น (ไม่ต้องรายงานเป็นผลงานสะสมทั้งปี)

2. ผลการเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับสหกรณ์ทุกประเภท	งานส่งเสริมทั่วไป (แห่ง)		งาน คก. พระราชดำริ (แห่ง)		งานโครงการหลวง (แห่ง)	
	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร
รวม	0	0	รวม	0	รวม	0
2.1 เข้าร่วมประชุมได้ ในเดือนนี้	2.1	0	2.1	0	2.1	0
2.2 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ในเดือนนี้	2.2	0	2.2	0	2.2	0
2.3 ไม่ได้จัดประชุมประจำเดือน ในเดือนนี้	2.3	0	2.3	0	2.3	0

3. ผลการเข้าร่วม ประชุมกลุ่มสมาชิกกับสหกรณ์ภาคการเกษตร และสหกรณ์นอกภาคการเกษตรที่ดำเนินการในลักษณะสหกรณ์การเกษตร	งานส่งเสริมทั่วไป (แห่ง)		งาน คก. พระราชดำริ (แห่ง)		งานโครงการหลวง (แห่ง)	
	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร
รวม	0	0	รวม	0	รวม	0

หมายเหตุประกอบผลงาน : (ระบุเดือนที่ต้องการหมายเหตุการรายงาน) โดยอ้างอิง/กำกับข้อหรืออธิบายให้ชัดเจน (ข้อมูลเชิงตัวเลข/บรรยาย และระบุเอกสารอ้างอิงให้ครบถ้วน เพื่อกรมฯ สามารถวิเคราะห์ประโยชน์ได้)

- 1. ปัญหาและอุปสรรค
- 2. บัญชีสำเร็จของงาน
- 3. ชี้แจง หรือให้ข้อมูลประกอบผลงาน

บันทึกข้อมูล **5**

รูปที่ 55 แสดงหน้าจอบรรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ



5.1.6 ประวัติการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัด

1. ระบบแสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ปุ่ม ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ

รายงานผลงาน/โครงการ

กระดานข้อความส่วนกลาง

พบทั้งหมด 9 งาน/โครงการ

งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนงานที่	
				ทั้งหมด	ผลการเบิกจ่าย	% ทั้ปี		
1. แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของ สทสรณ์/กลุ่มเกษตรกร	01/10/2563 - 30/09/2564	9	 57.82%	3,300,700	1,980,527	 60%	2	
2. โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ]	01/10/2563 - 30/09/2564	7	 50.00%	4,200	1,050	 25%	5	

รูปที่ 56 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการ

3. ระบบจะแสดงหน้าจอประวัติการบันทึกผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังรูป



ประวัติการบันทึกผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด : งานแบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของ สทสรณ์/กลุ่มเกษตรกร


วัน/เดือน/ปีที่แก้ไข	รอบเดือน/ปี	หน่วยงาน	ผู้แก้ไข
19/04/2564 3:20PM	เม.ย. 64	สำนักงาน สทสรณ์จังหวัด	เสด็จวิไล เกษมทรัพย์
19/04/2564 3:20PM	เม.ย. 64	สำนักงาน สทสรณ์จังหวัด	เสด็จวิไล เกษมทรัพย์
22/03/2564 1:21PM	มี.ค. 64	สำนักงาน สทสรณ์จังหวัด	เสด็จวิไล เกษมทรัพย์
22/03/2564 1:21PM	มี.ค. 64	สำนักงาน สทสรณ์จังหวัด	เสด็จวิไล เกษมทรัพย์
23/02/2564 3:54PM	ก.พ. 64	สำนักงาน สทสรณ์จังหวัด	เสด็จวิไล เกษมทรัพย์
23/02/2564 3:54PM	ก.พ. 64	สำนักงาน สทสรณ์จังหวัด	เสด็จวิไล เกษมทรัพย์
19/01/2564 3:13PM	ม.ค. 64	สำนักงาน สทสรณ์จังหวัด	เสด็จวิไล เกษมทรัพย์
19/01/2564 3:13PM	ม.ค. 64	สำนักงาน สทสรณ์จังหวัด	เสด็จวิไล เกษมทรัพย์
26/12/2563 4:52PM	ธ.ค. 63	สำนักงาน สทสรณ์จังหวัด	เสด็จวิไล เกษมทรัพย์
26/12/2563 4:52PM	ธ.ค. 63	สำนักงาน สทสรณ์จังหวัด	เสด็จวิไล เกษมทรัพย์
26/12/2563 4:51PM	พ.ย. 63	สำนักงาน สทสรณ์จังหวัด	เสด็จวิไล เกษมทรัพย์
26/12/2563 4:51PM	พ.ย. 63	สำนักงาน สทสรณ์จังหวัด	เสด็จวิไล เกษมทรัพย์
26/12/2563 4:48PM	ต.ค. 63	สำนักงาน สทสรณ์จังหวัด	เสด็จวิไล เกษมทรัพย์
26/12/2563 4:48PM	ต.ค. 63	สำนักงาน สทสรณ์จังหวัด	เสด็จวิไล เกษมทรัพย์

รูปที่ 57 แสดงหน้าจอประวัติการบันทึกผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด










5.1.7 ประวัติการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ระบบแสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม  ค้นหา
2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ปุ่ม  ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ

 รายงานผลงาน/โครงการ

กระดานข้อความส่วนกลาง

พบทั้งหมด 9 งาน/โครงการ 

งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนงานที่	
				ทั้งหมด	ผลการเบิกจ่าย	% ทั้งปี		
1. แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของ สทสรณ์/กลุ่มเกษตรกร	01/10/2563 - 30/09/2564	9	 57.82%	3,300,700	1,980,527	 60%	2	
2. โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ]	01/10/2563 - 30/09/2564	7	 50.00%	4,200	1,050	 25%	5	

รูปที่ 58 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการ

3. ระบบจะแสดงหน้าจอประวัติการบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณดังรูป

ประวัติการบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งานแบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของ สทสรณ์/กลุ่มเกษตรกร

วัน/เดือน/ปีที่แก้ไข	รอบเดือน/ปี	หน่วยงาน	ผู้แก้ไข
05/05/2564 3:28PM	ม.ค. 64	สำนักงาน สทสรณ์จังหวัด	
24/03/2564 3:57PM	มี.ค. 64	สำนักงาน สทสรณ์จังหวัด	
18/03/2564 1:37PM	ก.พ. 64	สำนักงาน สทสรณ์จังหวัด	
18/03/2564 1:36PM	ม.ค. 64	สำนักงาน สทสรณ์จังหวัด	
10/03/2564 9:53AM	ก.พ. 64	สำนักงาน สทสรณ์จังหวัด	
25/01/2564 4:48PM	ธ.ค. 63	สำนักงาน สทสรณ์จังหวัด	
25/01/2564 4:41PM	ม.ค. 64	สำนักงาน สทสรณ์จังหวัด	

รูปที่ 59 แสดงหน้าจอประวัติการการบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ



5.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่คุณเกี่ยวข้อง

1. คลิกเมนู รายงานความก้าวหน้า >> งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่คุณเกี่ยวข้อง ดังรูป

ระบบบริหารจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

บึงประมาณ : 2565
สวัสดิ์ : คุณผู้แจ้งจังหวัด (ผู้ดูแลระบบย่อย)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
หน้าหลัก | แก้ไขข้อมูลส่วนตัว | ออกจากระบบ

ระบบเครื่องมือกลาง งาน/โครงการ/กิจกรรม บริหารงานโครงการ **รายงานความก้าวหน้า** รายงาน (1) รายงาน (2)

ตั้งค่าการแจ้งเตือนกำหนดส่งรายงาน

พบทั้งหมด 1 งาน/โครงการ

รายงานผลงาน/โครงการ/กิจกรรม

งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่คุณเกี่ยวข้อง ← 1

ลำดับที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	แผนงานที่	
1	แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทดสอบ	30 หน่วยงาน •สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ •สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี •สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ •สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร •สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	01/10/2564 - 30/09/2565	1	1	

รูปที่ 60 แสดงหน้าหลักระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ

2. ระบบแสดงหน้าจองาน/โครงการที่คุณเกี่ยวข้อง และผ่านการอนุมัติดังรูป กรอกชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
3. ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ชื่อของโครงการเพื่อดูรายละเอียด
4. หากต้องการวางแผนการดำเนินงานคลิกที่ปุ่ม หากต้องการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการคลิกที่ปุ่ม หากต้องการรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่ปุ่ม และหากต้องการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณคลิกที่ปุ่ม ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ
5. กรณีต้องการเรียกดูกิจกรรมย่อยของงาน/โครงการที่คุณเกี่ยวข้อง คลิกที่จำนวนกิจกรรมของโครงการที่ต้องการเพื่อเรียกดูข้อมูลกิจกรรม

งาน/โครงการที่คุณเกี่ยวข้อง และผ่านการอนุมัติ

พบทั้งหมด 9 งาน/โครงการ

ลำดับที่	งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานของท่านได้รับโอนแล้ว	การแจ้งเตือน	
1	ทดสอบโครงการเล่มบี (กำลังดำเนินการ)	01/10/2563 - 31/01/2565	1	25,000	0.00		
2	ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ (กำลังดำเนินการ)	01/10/2563 - 30/09/2564	4	1,110,600	106,922.50		
3	โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP (กำลังดำเนินการ)	01/10/2563 - 30/09/2564	3	13,195,900	4,800.00		


รูปที่ 61 แสดงหน้าจองาน/โครงการที่คุณเกี่ยวข้อง และผ่านการอนุมัติ




บทที่ 6 ระบบรายงาน

ระบบรายงาน เป็นการเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ ของระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ

6.1 รายงานยุทธศาสตร์, แผนงานประจำปี


1. คลิ๊กเมนู รายงาน (1) >> รายงานยุทธศาสตร์, แผนงานประจำปี
2. ระบบจะเปิดหน้าจอรายงานยุทธศาสตร์ และแผนงานประจำปีงบประมาณปัจจุบันดังรูป ในส่วนนี้ ท่านสามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ได้ โดยคลิ๊ก  **ส่งออกเป็น Excel**

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
	ส่งออกเป็น Excel
ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	
แผนงาน: แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	
ผลผลิต: โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า	
กิจกรรมหลัก: สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย	
กิจกรรมรอง: สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย	
งาน/โครงการ: โครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในลักษณะครบวงจรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564	
กิจกรรม: ประสานงาน แนะนำ กำกับ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในลักษณะครบวงจรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	
กิจกรรม: การจัดอบรม หลักสูตรส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในลักษณะครบวงจรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	
กิจกรรม: การจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกการทำเกษตรผสมผสานในลักษณะครบวงจร หลังสมาชิกเข้ารับการอบรมเสร็จสิ้น ภายใน 7 วัน	
กิจกรรม: การจัดทำรายงานการอบรมหลังจากที่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้ารับการอบรมเสร็จแล้ว เฉพาะหน่วยงานที่จัดอบรม	
กิจกรรม: การติดตาม รายงานผลการดำเนินโครงการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ	
งาน/โครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP	
กิจกรรม: แนะนำ กำกับ ส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรปลอดภัยโดยดำเนินการตามกระบวนการผลิตสินค้าตามขั้นตอนของมาตรฐาน GAP	
กิจกรรม: ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ปี 2563	
กิจกรรม: ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP ปี 2564	
งาน/โครงการ: โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2564	
กิจกรรม: จัดอบรมหลักสูตรวิเคราะห์ดินและปรับปรุงดิน	
กิจกรรม: จัดอบรมหลักสูตรการจัดการผลิตปาล์มน้ำมันเข้าสู่มาตรฐาน RSPO	
งาน/โครงการ: ทดสอบโครงการเลื่อนปี	
กิจกรรม: ทดสอบโครงการเลื่อนปี	
ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	
แผนงาน: แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	
ผลผลิต: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	
กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์	
กิจกรรมรอง: ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์	
งาน/โครงการ: พัฒนามูลค่าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	
กิจกรรม: โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งท้องถิ่น"	
กิจกรรม: โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์"	
งาน/โครงการ: พัฒนามูลค่าการในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป	
กิจกรรม: โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การจัดการเรียนรู้อาชีพสหกรณ์ในสถานศึกษา"	

รูปที่ 62 แสดงหน้าจอรายงานยุทธศาสตร์, แผนงานประจำปี



6.2 แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการ (Action Plan)

1. คลิกเมนู รายงาน (1) >> แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการ (Action Plan)
2. ระบบจะเปิดหน้าจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการ (Action Plan) ดังรูป จากนั้นคลิกปุ่ม  เพื่อเลือกโครงการ แล้วคลิกที่ **แสดงข้อมูล**


แบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ

โครงการ : ...

หน่วยงาน : **สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี**

แสดงข้อมูล 2

รูปที่ 63 แสดงหน้าจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการ (Action Plan)

3. ระบบจะเปิดหน้าจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/ โครงการ ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิก  **ส่งออกเป็น Excel**

ส่งออกเป็น Excel 3

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
กิจกรรมหลัก : นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
กิจกรรมรอง : โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
งาน/โครงการ : โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายนอกเหนือจากโครงการเสริมสร้าง]

ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งาน	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แผนการดำเนินงาน(รายเดือนไม่ใช่อยอดสะสม)												แผนสะสม	
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
			ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64		
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ																
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพการเกษตร	ราย	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	26
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น [ประเมินผลงานภาพรวม โดย กพท.]	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.การจัดทำฐานข้อมูลและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมความรู้พัฒนาด้านการประกอบอาชีพการเกษตร																
1.1.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดดำเนินการคัดเลือกลูกหลานเกษตรกรที่มีความพร้อมจากผู้ร่วมโครงการในปี 2563 ตามจำนวนและหลักเกณฑ์ที่ กพท. กำหนด	ราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รูปที่ 64 แสดงหน้าจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการ



6.3 แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ

1. คลิกเมนู รายงาน (1) >> แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ
2. ระบบจะเปิดหน้าจอแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการดังรูป จากนั้นคลิกปุ่ม



เพื่อเลือกโครงการ แล้วคลิกที่ **แสดงข้อมูล**

แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ : ...

หน่วยงาน : **สำนักงานสทสรณ์จังหวัดจันทบุรี**

แสดงข้อมูล 2

รูปที่ 65 แสดงหน้าจอแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ

3. ระบบจะเปิดหน้าจอแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการดังรูป ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิก **ส่งออกเป็น Excel**

แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
สำนักงานสทสรณ์จังหวัดมุกดาหาร

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ผลผลิต: โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
กิจกรรมหลัก: นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
กิจกรรมรอง: โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
งาน/โครงการ : โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายนอกเหนือจากโครงการเสริมสร้าง]

ส่งออกเป็น Excel 3

ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งาน	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน-ผลการดำเนินงาน/ ความก้าวหน้าของงาน (รายเดือนไม่ใช่ยอดสะสม)												ยอดสะสม		
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
			ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ																	
1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพการเกษตร	ราย	26	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	26.00
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น [ประเมินผลงานภาพรวม โดย กพท.]	ร้อยละ	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม																	
1.การจัดทำฐานข้อมูลและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมความรู้พัฒนาการประกอบอาชีพการเกษตร																	
1.1.สำนักงานสทสรณ์จังหวัดดำเนินการคัดเลือกลูกหลานเกษตรกรที่มีความพร้อมจากผู้ร่วมโครงการในปี 2563 ตามจำนวนและหลักเกณฑ์ที่ กพท. กำหนด	ราย	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผล	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	26.00

รูปที่ 66 แสดงหน้าจอแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ



6.4 แบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ โครงการ

1. คลิกเมนู รายงาน (1) >> แบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ โครงการ
2. ระบบจะเปิดหน้าจอแบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ โครงการดังรูป จากนั้นคลิกปุ่ม



เพื่อเลือกโครงการ จากนั้นคลิกที่ แสดงข้อมูล

แบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ตามผลผลิต/โครงการ

โครงการ : ...

หน่วยงาน :

และ

รูปที่ 67 แสดงหน้าจอแบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ โครงการ

3. ระบบจะเปิดหน้าจอแบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ โครงการดังรูป ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิก **ส่งออกเป็น Excel**

แบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ตามผลผลิต/โครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร


แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
กิจกรรมหลัก : นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
กิจกรรมรอง : โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
งาน/โครงการ : โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ)
หน่วย : ล้านบาท

โครงการ/ กิจกรรม/งาน	งบ ประมาณ	ได้รับโอน	แผน-ผลการเบิกจ่าย (รายเดือนไม่ใช่ออกสะสม)												ยอด สะสม	
			ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
			ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64		
1.โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ)	3.7157	0.0042	แผน	-	-	-	-	0.0011	-	0.0021	-	0.0011	-	-	-	0.0043
			ผล	-	-	-	-	0.0011	-	-	-	-	-	-	-	0.0011
งบลงทุน			แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบบุคลากร			แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน			แผน	-	-	-	-	0.0011	-	0.0021	-	0.0011	-	-	-	0.0043

รูปที่ 68 แสดงหน้าจอแบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ โครงการ



6.5 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ สะสมทั้งปี

1. คลิกเมนู รายงาน (1) >> รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ สะสมทั้งปี
2. ระบบจะเปิดหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ สะสมทั้งปีดังรูป จากนั้นคลิกปุ่ม  เพื่อเลือกโครงการ, เลือกรายงานประจำเดือน และเลือกเขตตรวจราชการ จากนั้นคลิกที่ **แสดงข้อมูล**

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ สะสมทั้งปี


ผลผลิต/โครงการ :


รายงานประจำเดือน: ตุลาคม - กันยายน

เขตตรวจราชการที่: --แสดงทั้งหมด--

แสดงข้อมูล 2

รูปที่ 69 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ สะสมทั้งปี

3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการสะสมทั้งปีที่เรียกดูดังรูป ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิก  **ส่งออกเป็น Excel**

 **ส่งออกเป็น Excel** 3


รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ สะสมทั้งปี
ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนงาน : แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
ผลผลิต : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการค้าเงินงานในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์
งาน/โครงการ : ธนาคารสินค้าเกษตร [ข้าว]

ที่	สังกัดพื้นที่	หน่วยงานที่แสดงผล	ธนาคารสินค้าเกษตร [ข้าว]																	
			1. จำนวนสินเชื่อที่มีการชำระจัดการในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตร [รวมฝากกลุ่มเดิม] (แห่ง)			2. จำนวนธนาคารสินค้าเกษตรที่ได้รับ การส่งเสริม และจัดตั้ง [ในพื้นที่แปลงใหญ่] (แห่ง)			3. จำนวนธนาคารสินค้าเกษตรที่ได้รับการส่งเสริม และจัดตั้ง [นอกพื้นที่แปลงใหญ่] (แห่ง)			4. จำนวนสมาชิกที่ใช้นิติกรธนาคารข้าว (รวม)			5. รายจ่ายในโครงการ (บาท)			6. ต้นทุนการผลิต (บาท)		
			แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1	เขตตรวจราชการที่ 1	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รูปที่ 70 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการสะสมทั้งปี

6.6 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง

1. คลิกเมนู รายงาน (1) >> รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง
2. ระบบจะเปิดหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังดังรูป เลือกหน่วยงาน แล้วคลิกปุ่ม  เพื่อเลือกโครงการที่ต้องการเปรียบเทียบ จากนั้นคลิกที่ **แสดงข้อมูล**


รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง


หน่วยงาน:

ปีงบประมาณ: 2565 ผลผลิต/โครงการ : ...

ปีงบประมาณ: 2564 ผลผลิต/โครงการ : ...

รูปที่ 71 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง

3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังที่เรียกดูดังรูป ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลได้ โดยคลิก  จากนั้นเลือกประเภทที่ต้องการส่งออก

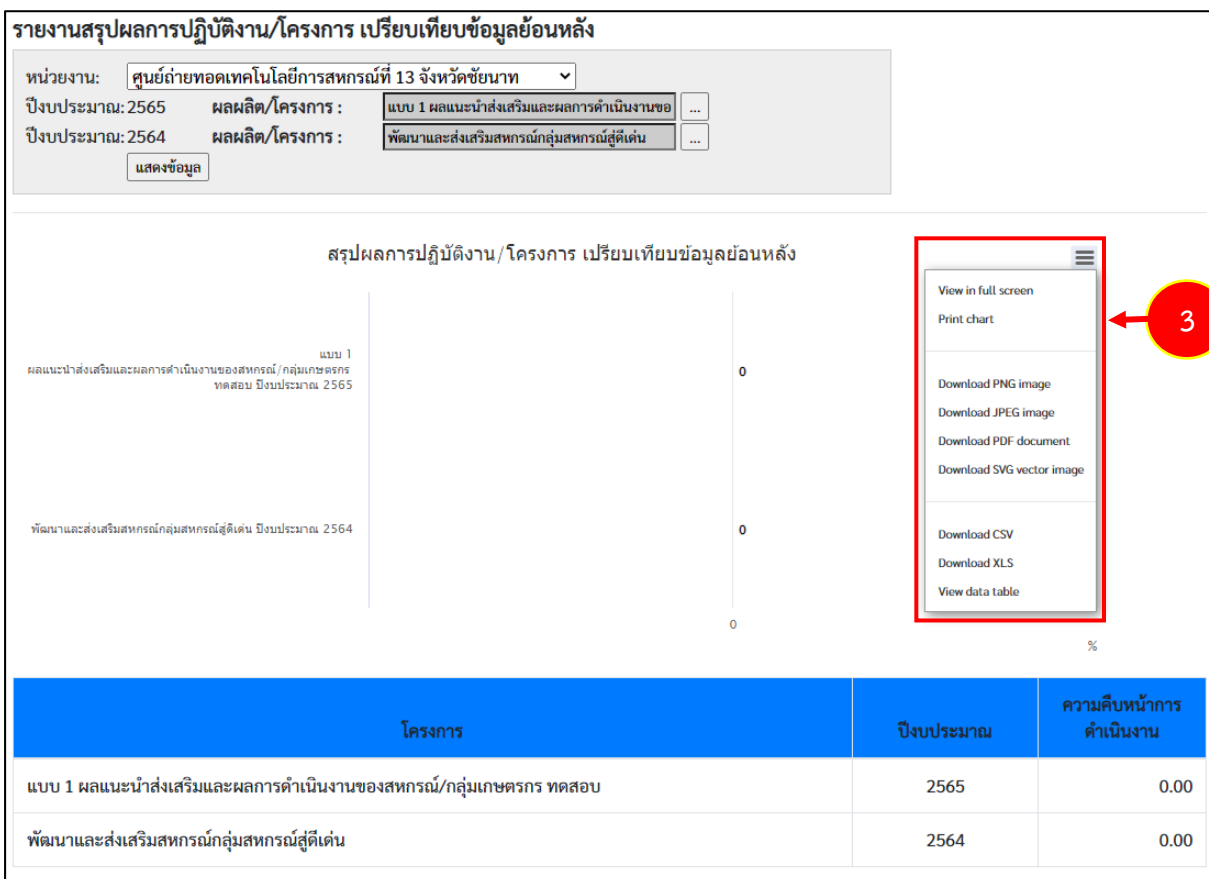

รูปที่ 72 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการสะสมทั้งปี

6.7 รายงานสรุปการส่งรายงาน รายหน่วยงาน

1. คลิกเมนู รายงาน (2) >> สรุปการส่งรายงาน รายหน่วยงาน
2. ระบบจะเปิดหน้าจอสรุปการส่งรายงานรายหน่วยงานดังรูป เลือกโครงการ เลือกรูปแบบในการเรียกดู และเลือกรายงานประจำเดือน แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา

สรุปการส่งรายงาน รายหน่วยงาน

ปีงบประมาณ: 2565


โครงการ: [Dropdown Arrow]

รูปแบบในการเรียกดู ไตรมาส รายเดือน

รายงานประจำเดือน: ตุลาคม - กันยายน

ค้นหา

รูปที่ 73 แสดงหน้าจอสรุปการส่งรายงาน (เฉพาะแต่ละหน่วยงาน)

3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปการส่งรายงานรายหน่วยงานที่เรียกดูดังรูป ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิก  ส่งออกเป็น Excel

สรุปการส่งรายงาน รายหน่วยงาน

ปีงบประมาณ: 2565

โครงการ: ทดสอบโครงการของ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร

รูปแบบในการเรียกดู ไตรมาส รายเดือน

รายงานประจำเดือน: ตุลาคม - กันยายน

ค้นหา

สรุปการส่งรายงานในแต่ละเรื่อง ของหน่วยงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน: แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :

ผลผลิต: สทสรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์

โครงการ: ทดสอบโครงการของ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ส่วนกลาง

นิยามของแต่ละสี


- ส่งรายงานแล้วปกติ
- ส่งรายงานล่าช้า
- ยังไม่ส่งรายงาน


ลำดับ	หน่วยงาน	สถานะการส่งรายงาน											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1)	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2)	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

รูปที่ 74 แสดงหน้าจอรายงานสรุปการส่งรายงานรายหน่วยงาน



6.8 สรุปการส่งรายงาน รายโครงการ

1. คลิกเมนู รายงาน (2) >> สรุปการส่งรายงาน รายโครงการ
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานสรุปการส่งรายงาน รายโครงการดังรูป เลือกปีงบประมาณ และเลือกรายงานประจำเดือน จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปการส่งรายงาน รายโครงการที่เรียกดู กรณีที่พบข้อมูลสามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิกที่  **ส่งออกเป็น Excel**

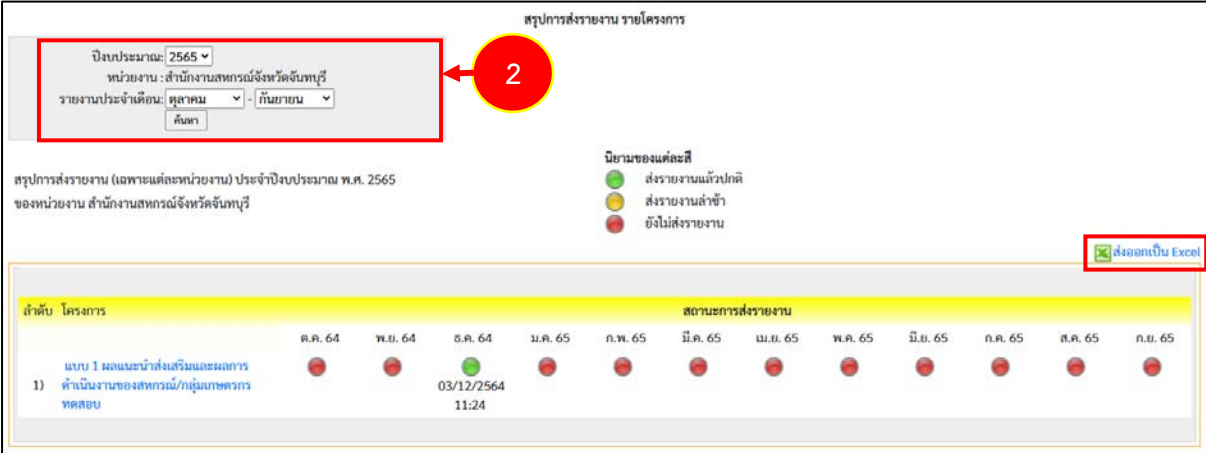

สรุปการส่งรายงาน รายโครงการ

ปีงบประมาณ: 2565
หน่วยงาน : สำนักงานสทสรณ์จังหวัดจันทบุรี
รายงานประจำเดือน: ตุลาคม - กันยายน
ค้นหา

สรุปการส่งรายงาน (เฉพาะแต่ละหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของหน่วยงาน สำนักงานสทสรณ์จังหวัดจันทบุรี

นิยามของแต่ละสี
● ส่งรายงานแล้วปกติ
● ส่งรายงานล่าช้า
● ยังไม่ส่งรายงาน

ลำดับ โครงการ	สถานะการส่งรายงาน											
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65
1) แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสทสรณ์/กลุ่มเกษตรกรทดสอบ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ส่งออกเป็น Excel

รูปที่ 75 แสดงหน้าจอสรุปการส่งรายงาน รายโครงการ



6.9 รายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายโครงการ

1. คลิกเมนู รายงาน (2) >> รายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายโครงการ
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายโครงการดังรูป เลือก ปีงบประมาณ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา

รายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายโครงการ

ปีงบประมาณ: 2564 ▾

หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ค้นหา 2

รูปที่ 76 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายโครงการ

3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายโครงการที่เรียกดูในส่วนนี้สามารถ ส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิกที่ **ส่งออกเป็น Excel**

รายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายโครงการ

ปีงบประมาณ: 2564 ▾

หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ค้นหา

รายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายหน่วยงาน
ของหน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร


ส่งออกเป็น Excel 3


ลำดับ	โครงการ	งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน		งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบรายจ่ายอื่น		รวม	
		งบที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	งบที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	งบที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	งบที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	งบที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	งบที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย
1)	แบบ 1 ผล แนะนำส่งเสริม และผลการ ดำเนินงานของ สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,700.00	1,980,527.44	0.00	0.00	3,300,700.00	1,980,527.44
2)	แบบ 2 ผลการ กำกับดูแล ตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รูปที่ 77 แสดงหน้าจอรายงานเบิกจ่ายต่องบประมาณเปรียบเทียบกับ % แผนการใช้จ่ายเงินต่อวงเงินงบประมาณ



6.10 รายงานเบิกจ่ายต่องบประมาณเปรียบเทียบกับ % แผนการใช้จ่ายเงินต่อวงเงินงบประมาณ

1. คลิกเมนู รายงาน (2) >> รายงานเบิกจ่ายต่องบประมาณเปรียบเทียบกับ % แผนการใช้จ่ายเงินต่อวงเงินงบประมาณ
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานเบิกจ่ายต่องบประมาณเปรียบเทียบกับ % แผนการใช้จ่ายเงินต่อวงเงินงบประมาณดังรูป ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิก  **ส่งออกเป็น Excel**

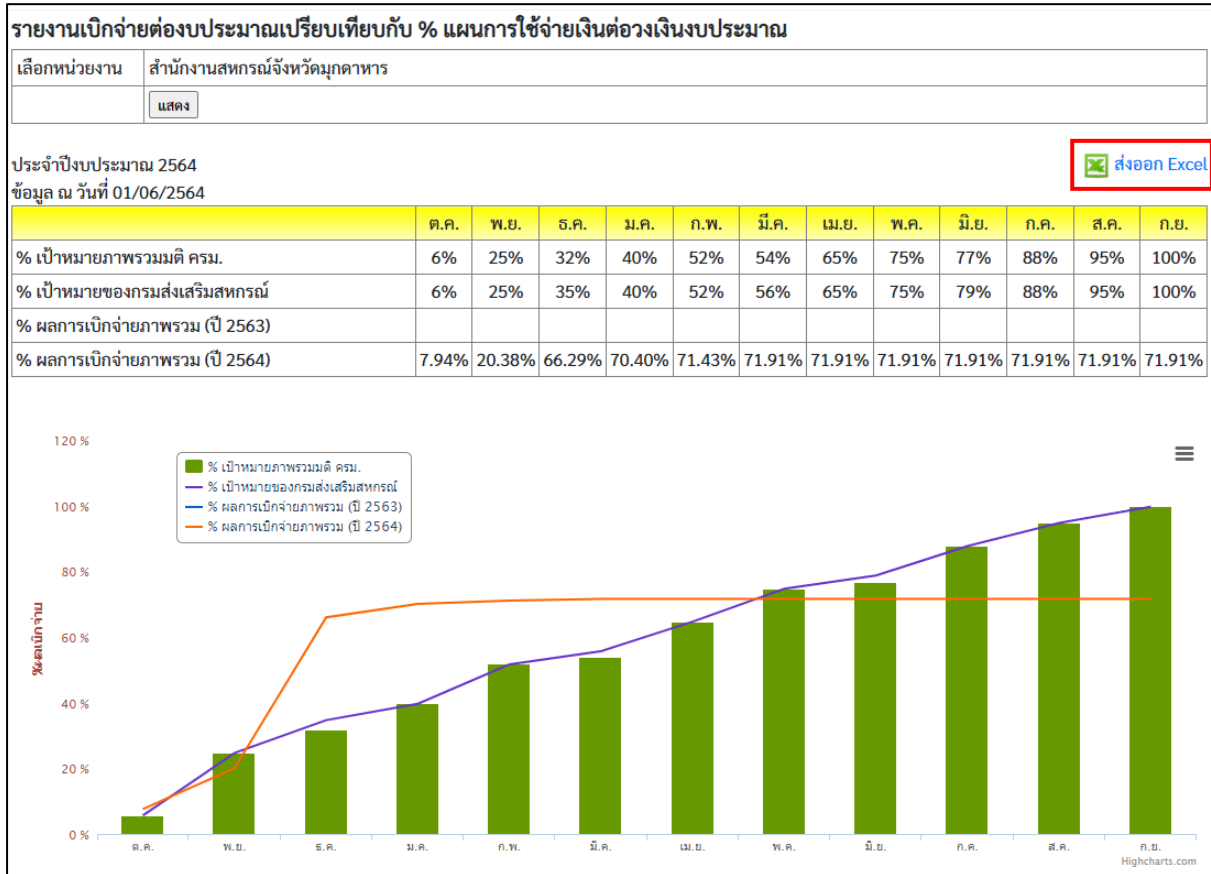


รูปที่ 78 แสดงหน้าจอรายงานเบิกจ่ายต่องบประมาณเปรียบเทียบกับ % แผนการใช้จ่ายเงินต่อวงเงินงบประมาณ



6.11 รายงานผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย)

1. คลิกเมนู รายงาน (2) >> ผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย)
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย)


ดังรูป ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิก  **ส่งออกเป็น Excel**

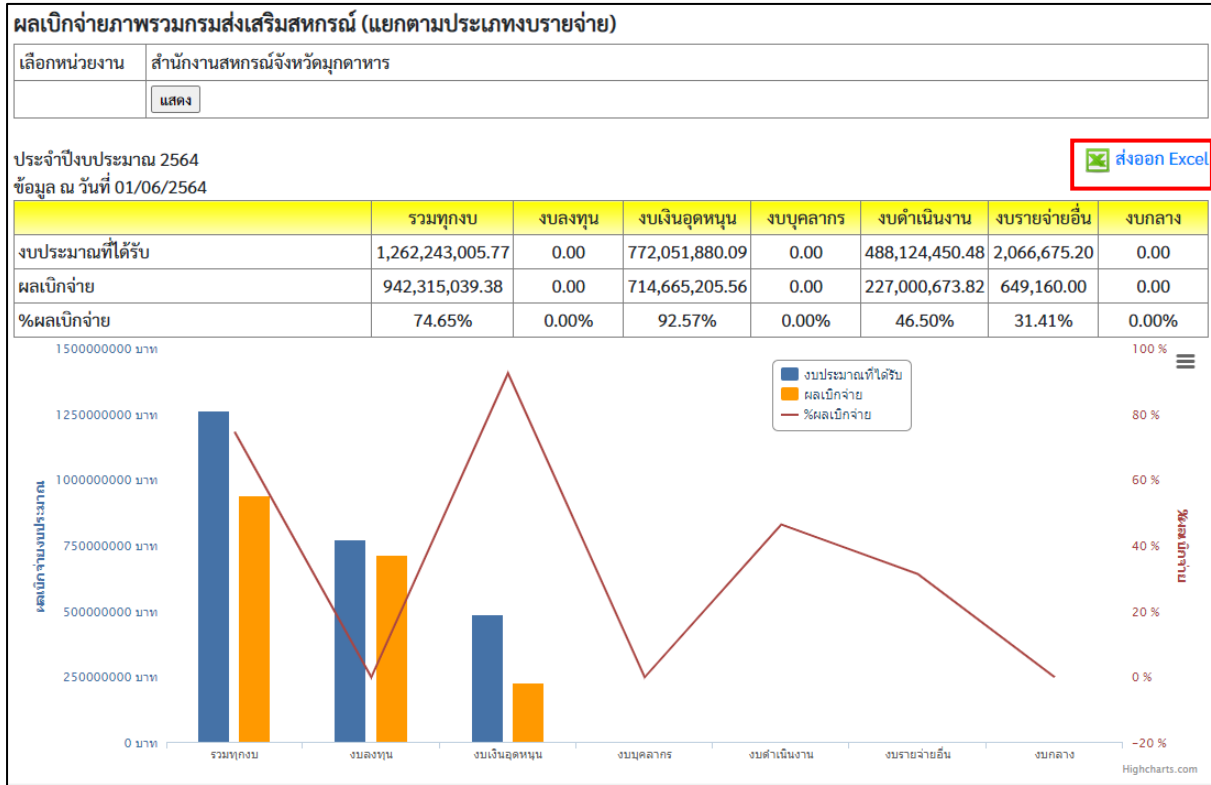

รูปที่ 79 แสดงหน้าจอรายงานผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย)



6.12 รายงานสรุป % ผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน

1. คลิกเมนู รายงาน (2) >> สรุป % ผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานสรุป % ผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงานดังรูป ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิก  [ส่งออกเป็น Excel](#)

ลำดับ	ชื่อศูนย์ต้นทุน	%ผลเบิกจ่าย
ส่วนกลาง		
1	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1	45.31%
2	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2	65.21%
3	กลุ่มตรวจสอบภายใน	0.00%
4	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	0.00%
5	กองการเจ้าหน้าที่	0.00%
6	กองคลัง	0.00%
7	กองประสานงานโครงการพระราชดำริ	0.00%
8	กองแผนงาน	0.00%
9	กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์	0.00%
10	กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า	0.00%
11	กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	0.00%
12	ผู้ตรวจราชการกรม	0.00%
13	ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์	0.00%
14	ศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง	0.00%
15	ศูนย์สารสนเทศ	0.00%
16	สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์	0.00%
17	สำนักงานเลขานุการกรม	0.00%
18	สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย	0.00%
19	สำนักบริหารเงินทุน	0.00%
20	สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์	0.00%


รูปที่ 80 แสดงหน้าจอรายงานสรุป % ผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน



6.13 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน

1. คลิกเมนู รายงาน >> สรุปผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงานดังรูป ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูล



เป็น Excel ได้ โดยคลิก  **ส่งออกเป็น Excel**


ลำดับ	ชื่อศูนย์ต้นทุน	เงินงบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	%ผลเบิกจ่าย
สรุปผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน					
ประจำปีงบประมาณ 2564					
ข้อมูล ณ วันที่ 01/06/2564					
 ส่งออก Excel					
ส่วนกลาง					
1	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1	2,128,700.00	964,598.10	1,164,101.90	45.31%
2	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2	3,971,800.00	2,590,080.59	1,381,719.41	65.21%
3	กลุ่มตรวจสอบภายใน	-	-	-	0.00%
4	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	-	-	-	0.00%
5	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	0.00%
6	กองคลัง	-	-	-	0.00%
7	กองประสานงานโครงการพระราชดำริ	-	-	-	0.00%
8	กองแผนงาน	-	-	-	0.00%
9	กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์	-	-	-	0.00%
10	กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า	-	-	-	0.00%
11	กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	-	-	-	0.00%
12	ผู้ตรวจราชการกรม	-	-	-	0.00%
13	ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์	-	-	-	0.00%
14	ศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง	-	-	-	0.00%
15	ศูนย์สารสนเทศ	-	-	-	0.00%
16	สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์	-	-	-	0.00%
17	สำนักงานเลขานุการกรม	-	-	-	0.00%
18	สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย	-	-	-	0.00%
19	สำนักบริหารเงินทุน	-	-	-	0.00%
20	สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์	-	-	-	0.00%
21	สำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์	-	-	-	0.00%
รวมส่วนกลาง		6,100,500.00	3,554,678.69	2,545,821.31	58.27%
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 1-20					
1	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี	587,700.00	-	587,700.00	0.00%

รูปที่ 81 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน



6.14 รายงานสถานะโครงการโดยรวม


1. คลิกเมนู รายงานอื่นๆ >> รายงานสถานะโครงการโดยรวม
2. ระบบจะแสดงรายงานสถานะโครงการโดยรวม และแสดงรายชื่อแผนงาน/โครงการทั้งหมด สามารถเรียกดูรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการโดยคลิกปุ่ม  ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ หากต้องการเรียกดูรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ให้คลิกปุ่ม  ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ

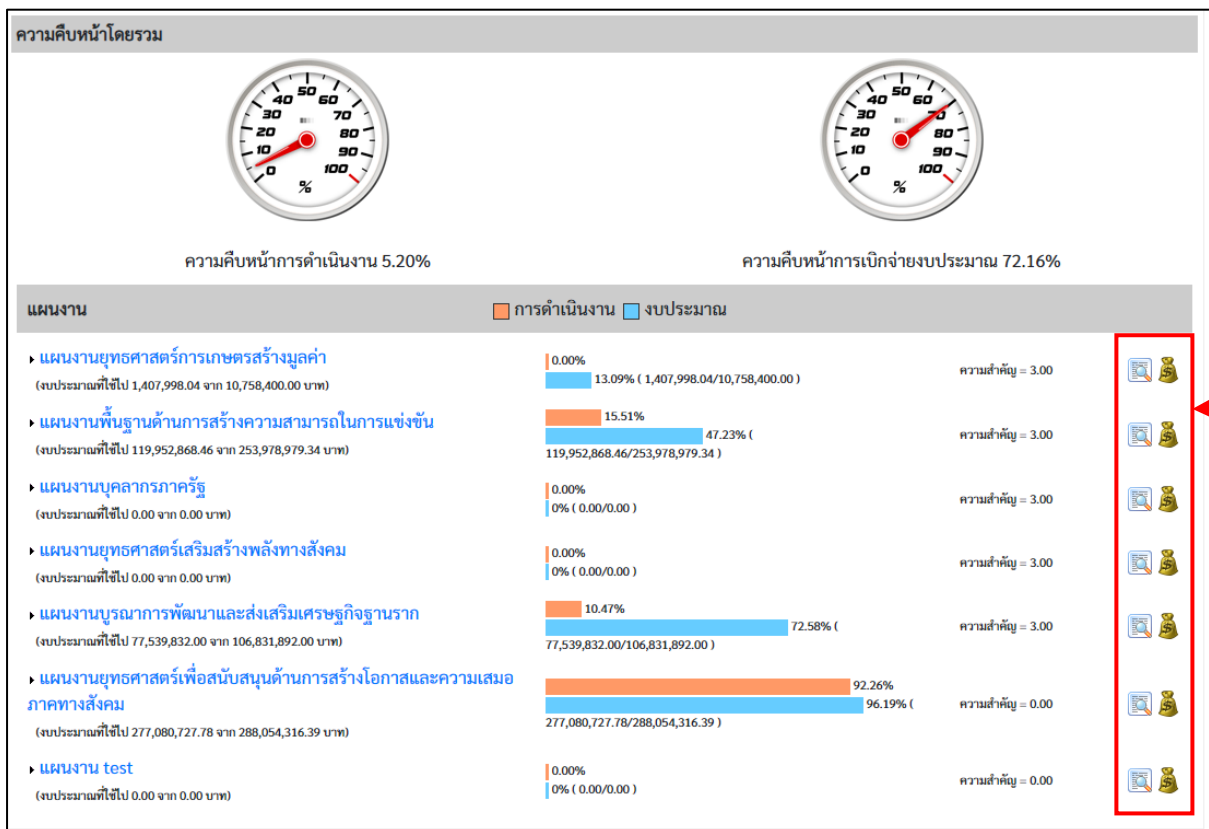

รูปที่ 82 แสดงหน้าจอรายงานสถานะโครงการโดยรวม



6.15 รายงานการจัดการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง)

1. คลิกเมนู รายงานอื่นๆ >> การจัดการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง)
2. ระบบจะเปิดหน้าจอการจัดการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง) ดังรูป จากนั้นคลิกปุ่ม  เพื่อเลือกโครงการ เลือกปีงบประมาณ เลือกแสดงปัจจัยที่ยังคงความเสี่ยงอยู่ หรือ ปัจจัยที่ไม่มีความเสี่ยง และเลือกรายงานประจำเดือน จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา

การจัดการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง)

ปีงบประมาณ: 2564 ▾


โครงการ:

แสดง: ==ทั้งหมด== ▾

รายงานประจำเดือน: พฤษภาคม ▾

ค้นหา 2

รูปที่ 83 แสดงหน้าจอการจัดการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง)

3. ระบบจะแสดงรายงานการจัดการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง) ที่เรียกดูดังรูป ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิก  **ส่งออกเป็น Excel**

การจัดการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง)


ปีงบประมาณ: 2564 ▾

โครงการ:

แสดง: ปัจจัยที่ไม่มีความเสี่ยงแล้ว ▾

รายงานประจำเดือน: ตุลาคม ▾

ค้นหา

 ส่งออกเป็น Excel 3

สรุปสถานะการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน: แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :

ผลผลิต: โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

กิจกรรมรอง: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

โครงการ: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ปัจจัยที่	ชื่อปัจจัยเสี่ยง	ระดับความร้ายแรง	จำนวนหน่วยงาน		สถานะปัจจุบัน
			ที่ยังมีปัจจัยเสี่ยง	ที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงแล้ว	
ไม่มีข้อมูลปัจจัยเสี่ยง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร					

รูปที่ 84 แสดงหน้าจอรายงานการจัดการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง)



6.16 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน

1. คลิกเมนู รายงานอื่นๆ >> รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน
2. ระบบจะเปิดหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือนดังรูป จากนั้นเลือกหน่วยงาน, ด้าน, หัวข้อจาก List box แล้วคลิกปุ่ม แสดง

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน

เลือกหน่วยงาน	สำนักงานสทกรรมจังหวัดมุกดาหาร
เลือกด้าน	-โปรดเลือก-
เลือกหัวข้อ	-โปรดเลือก-
<div style="border: 1px solid red; display: inline-block; padding: 5px;">แสดง</div> 2	

รูปที่ 85 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน

3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือนที่เรียกดู ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิกที่ ส่งออกเป็น Excel

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน

เลือกหน่วยงาน	สำนักงานสทกรรมจังหวัดมุกดาหาร
เลือกด้าน	-โปรดเลือก-
เลือกหัวข้อ	-โปรดเลือก-
<div style="border: 1px solid red; display: inline-block; padding: 5px;">Excel Excel</div> 3	

รหัส	ชื่อ	ชื่อเต็ม	รายการ	หน่วยนับ	ยอดสะสม	ค.น.	ค.น.	ค.น.	ค.น.	ค.น.	ค.น.	ค.น.
						๐๐๐	๐๐๐	๐๐๐	๐๐๐	๐๐๐	๐๐๐	๐๐๐
1			1.ระบบงานนายทะเบียนสทกรรมและงานสนับสนุน การบริหารจัดการและกลุ่มเกษตร									
	1.1		ให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจ ชุมชน ราชภัฏเมืองผู้ดีและเกษตรกรทั่วไป และประชาชนทั่วไป ที่สนใจจัดตั้งเป็นสหกรณ์	ครั้ง	0							
				คน	0							
	1.3		สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้ง ขึ้นระหว่างปีงบประมาณ สามารถดำเนินการได้ (รวม 1.3.1 และ 1.3.2) แต่เป็น	แห่ง	0							
			สหกรณ์ ที่ดำเนินการได้ โดยได้จัดประชุมในวงประชุม อย่างน้อย 40 และต้องดำเนินการ (ปรากฏในวงประชุม) อย่างน้อย 1 ประชุมแล้ว	สหกรณ์	0							
	1.3.1		กลุ่มเกษตรกร ที่ดำเนินการได้ โดยได้จัดประชุมในวงประชุม แรก ตามมาตรา 16 วรรค 1 และต้องดำเนินการ (ปรากฏในวง ประชุม) อย่างน้อย 1 ประชุมแล้ว	กลุ่มเกษตรกร	0							
	1.3.2		สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้ง ขึ้นระหว่างปีงบประมาณ สามารถดำเนินการได้ โดยใน ปีงบประมาณมีงาน มีการประชุมและเกษตรกรที่แจ้งเรื่อง การ ประชุมในวงประชุมครั้งแรก (มีค่าเงินได้แสดงบัญชี) การ ประชุมในวงประชุม และต้องดำเนินการ (ปรากฏในวงประชุม)	แห่ง	0							
	1.4.1		สหกรณ์ ที่จัดตั้งขึ้นมีประธานเป็นสมาชิกได้	สหกรณ์	0							
	1.4.2		กลุ่มเกษตรกร ที่จัดตั้งขึ้นมีประธานที่มาจาก สำนักงาน	กลุ่มเกษตรกร	0							
	1.2		สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้ง ใน ปีงบประมาณมีงาน (รวม 1.2.1 และ 1.2.2)	แห่ง	0							
	1.2.1		สหกรณ์	สหกรณ์	0							
	1.2.2		กลุ่มเกษตรกร	กลุ่มเกษตรกร	0							
2			การบริหารงานตามแผนงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร									
	2.1		สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ที่ดำเนินกิจการมีเงิน ค.น. 54 - ค.น. 55) มีบัญชีเงินฝากตามบัญชีเงินฝากเงิน									
	2.1.1		มีบัญชีเงินฝาก 30 วัน (นับแต่วันมีเงินฝาก)	แห่ง	0							
			สหกรณ์	สหกรณ์	0							
			กลุ่มเกษตรกร	กลุ่มเกษตรกร	0							
	2.1.2		มีบัญชีเงินฝาก 31 - 150 วัน (นับแต่วันมีเงินฝาก)	แห่ง	0							
			สหกรณ์	สหกรณ์	0							
			กลุ่มเกษตรกร	กลุ่มเกษตรกร	0							
	2.1.3		มีบัญชีเงินฝากเกิน 150 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปีบัญชี (นับแต่วันมีเงินฝาก)	แห่ง	0							
			สหกรณ์	สหกรณ์	0							
			กลุ่มเกษตรกร	กลุ่มเกษตรกร	0							
	2.2		ใบมีงเงินฝากตามบัญชีเงินฝาก/ค.น. 10 ซึ่งงบการเงินของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ที่ดำเนินกิจการมีเงิน ค.น. 54 - ค.น. 55) โดยมีจำนวนเงินฝากตามบัญชีเงินฝาก	แห่ง	0							
	2.2.1		สหกรณ์	สหกรณ์	0							
	2.2.2		กลุ่มเกษตรกร	กลุ่มเกษตรกร	0							
	2.3		สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ที่ดำเนินกิจการมีเงิน ค.น. 54 - ค.น. 55) มีบัญชีเงินฝากตามบัญชีเงินฝากเงิน กลุ่มเกษตรกร โดยจำนวนเงินฝากตามบัญชีเงินฝาก มา (นับแต่วันมีเงินฝาก ค.น. 53 - ค.น. 54)	แห่ง	0							
	2.3.1		สหกรณ์	สหกรณ์	0							
	2.3.2		กลุ่มเกษตรกร	กลุ่มเกษตรกร	0							
	2.4		สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ที่ดำเนินกิจการมีเงิน ค.น. 54 - ค.น. 55) มีบัญชีเงินฝากตามบัญชีเงินฝากเงิน กลุ่มเกษตรกร	แห่ง	0							

รูปที่ 86 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน




6.17 รายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือน

1. คลิกเมนู รายงานอื่นๆ >> รายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือน
2. ระบบจะเปิดหน้าจอรายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือนดังรูป จากนั้นเลือกด้านที่ต้องการแสดงข้อมูล จาก List box แล้วคลิกปุ่ม แสดง

รายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือน

เลือกด้าน	--แสดงทั้งหมด--
	<input type="button" value="แสดง"/>

รูปที่ 87 แสดงหน้าจอรายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือน

3. ระบบจะแสดงรายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือนที่เรียกดู ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิกที่  ส่งออกเป็น Excel

รายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือน

เลือกด้าน	1.ด้านผลการปฏิบัติงาน
	<input type="button" value="แสดง"/>

ชื่อหน่วยงาน	สถานะการส่งข้อมูล ปี 2561											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1												
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่												

รูปที่ 88 แสดงหน้าจอรายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือน



6.18 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS

1. คลิกเมนู รายงานอื่นๆ >> รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS
2. ระบบจะเปิดหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS ดังรูป จากนั้นเลือกช่วงเดือนที่ต้องการแสดงข้อมูล แล้วคลิกปุ่ม แสดง

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS

เลือกหน่วยงาน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร		
เลือกเดือน	--โปรดเลือก--	ถึง	--โปรดเลือก--
	แสดง		

รูปที่ 89 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS

3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS ที่เรียกดู ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิกที่ **ส่งออกเป็น Excel**

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS

เลือกหน่วยงาน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร		
เลือกเดือน	ตุลาคม	ถึง	กันยายน
	ส่งออก Excel		

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :

แบบ Y56 NwP1 การเข้าปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำเดือน

ผลงานตามตัวชี้วัดของกิจกรรมหลัก	งานส่งเสริมทั่วไป (แห่ง)		งาน คก. พระราชดำริ (แห่ง)		งานโครงการหลวง (แห่ง)				
	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร			
1. ผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริม และติดตาม การดำเนินกิจการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ผลรวมเป้าหมายเท่ากับที่ปรากฏในทะเบียนแยกตามสถานะเป็น	รวม	0	0	รวม	0	0	รวม	0	0
1.1 ที่ดำเนินกิจการ	1.1			1.1			1.1		
1.2 ที่จัดทะเบียนจัดตั้งใหม่ปี 2556	1.2			1.2			1.2		
1.3 ที่จัดตั้งก่อนปี 2556 และยังไม่เริ่มดำเนินกิจการ	1.3			1.3			1.3		
1.4 ที่หยุดดำเนินกิจการ	1.4			1.4			1.4		
1.5 ที่อยู่ระหว่างกระบวนการเลิก /ชำระบัญชี (รวมถึงอยู่ระหว่างดำเนินคดี ถูกฟ้องล้มละลายและหาข้อมูลไม่พบ)	1.5			1.5			1.5		
ข้อ 2 กรอกเฉพาะผลงานที่เกิดขึ้นในเดือนที่รายงานผลเท่านั้น (ไม่ต้องรายงานเป็นผลงานสะสมทั้งปี)									
2. ผลการเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับสหกรณ์ทุกประเภท	งานส่งเสริมทั่วไป (แห่ง)		งาน คก. พระราชดำริ (แห่ง)		งานโครงการหลวง (แห่ง)				
	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร			
รวม	0	0	0	0	0	0			
2.1 เข้าร่วมประชุมได้ในเดือนนี้	2.1			2.1					
2.2 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในเดือนนี้	2.2			2.2					
2.3 ไม่ได้จัดประชุมประจำเดือน ในเดือนนี้	2.3			2.3					

รูปที่ 90 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS
